

ଅଧ୍ୟାୟ II
ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା

ଅଧ୍ୟାୟ II ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା

ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ

2.1 ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜରାଯାଇଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉପରେ ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା

କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସାରାଂଶ

ଜାତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ନୀତି, 1988 ରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରେ ଏବଂ ବନାବରଣ ଏବଂ ଅବଶ୍ୟକ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ପୁନରୁତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପରିଚାଳନା, ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ 51,619 ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଭାରତ ରାଜ୍ୟ ବନ ବିଦ୍ୟୋଗ 2019 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ଲୋଗୋଲିନ କ୍ଷେତ୍ରର 33.15 ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ ।

2013-14 ରୁ 2017-18 ଅବଧିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି "ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ" ର ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ:

- ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ଅଭାବ ସହିତ ସମାପିତ ହେଲା, ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅବାସ୍ତବ ଭାବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚାଇଲା । ଅବଶ୍ୟକ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଏବଂ ଖାଲି ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଜମି ସମନ୍ୱୟ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା କାରଣରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଣାଳୀ କେବଳ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ଭାଗ କରି ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିବା ବୈଷମ୍ୟରୁ, ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା । ଭେଞ୍ଜ, ବିଭାଗ ଏବଂ ବନ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତାମାନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ବାର୍ଷିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଯୋଜନା ସମନ୍ୱୟ ଆବଶ୍ୟକତା ତଥ୍ୟ ଯେପରିକି ଯୋଜନାଦ୍ୱାରା ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ, ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବ୍ୟୟ, ଜାରିତ ଥିବା ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଶତ ଇତ୍ୟାଦି ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷକ (ଓ ଏବଂ ଏକ୍ସ-ଏସ୍-ଏସ୍) ଭିତରେ ଅନୁରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
- ସ୍ଥାନୀୟ ରୁ-ଜଳବାୟୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜାତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ, ନିକଟ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ନୀତି (ଏସ୍-ଏସ୍-ଏସ୍) ଗଠନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଏସ୍-ଏସ୍-ଏସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଜ ବଳୟ ବୃଦ୍ଧିର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଜନା ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯୋଜନା/ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିକଳ୍ପନା ବିନା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ।
- ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକ୍ରମଣ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନଥିଲେ ଯେହେତୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଯଥା ବୃକ୍ଷରୋପଣର ପୂର୍ବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଥ୍ୟ, ଆବଶ୍ୟକ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ-ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟୟ, ଭେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ହ୍ରାସପାତ୍ର ଯାଞ୍ଚ, ବୃକ୍ଷରୋପଣର ବାସ୍ତବରେ ଥିବା (ଫରେଷ୍ଟର/ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ) ଏବଂ ଭେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିପ୍ରମାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନପାରିବାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ଅଧିପ୍ରମାଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ।
- ଶାଳ ପ୍ରକାରି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ସବେଶୀ ପ୍ରକାରି କିନ୍ତୁ ଶାଳୁଆନୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାରି ଭାବରେ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚତର ସମୂହ ଏବଂ କୈତ ବିବିଧତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ।
- ଏକ ବିଭାଜନରେ ଏମ୍-ସି-ଏନ-ଆର୍-ଇ-ସି-ଏସ୍ ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା କରିବାରେ ବନ ଶକ୍ତ ଅଧିକାରୀ (ଡି-ଏସ୍-ଓ) ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ଡି-ଆରଡି-ଏ) ଭିତରେ ଗୌଣସି ସମନ୍ୱୟ ନଥିଲା । ଡି-ଏସ୍-ଓ କିମ୍ବା ବିଭାଗରେ, ଏକ ବିଭାଜନରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟୋଗ୍ ଜବ୍ କାର୍ତ୍ତାଧୀନାକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ନଥିଲା ଯାହା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।

- 485 ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟରୁ 191 ଟି ସପ୍ତକ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 13.17 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା । ବିପାକର ଭାରଣ ଥିଲା ଘଷ୍ଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ଚଳ ଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସାର ବାଧାଲ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ।
- ଉଷଣାବେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଚାର ବର୍ଷରୁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ନହେବା କାରଣରୁ ଏମ୍‌ଜିଏନଆରକର୍ମ ଏହି ଅଧିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାଟିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନିଷ୍ଠିତତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ।
- ସିଏଏମ୍‌ପିଏ ଅଧିକରେ ଷଡ଼ିପୁରଜ ବନାବରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ବିଳ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିସରକୁ ଷଡ଼ିପୁରଜ ବିଆପାଇ ପାରିନଥିଲା ।
- ଅତିରୁ ଟିଏ ଏବଂ ଚଳ ଅଧିକାରୀମାନେ 41 ଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ବାଉଁଶ ଭାବରେ ଘାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ 20 ଟି ବିପାକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ସାତଟି ଆଂଶିକ ସପ୍ତକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅବଲୋକନ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ 2.67 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।
- ସୁଏସି ବ୍ୟବହାର କରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଅତିରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ପୂର୍ବପାଠରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ପରିଷ୍ଟ ଅବ କିଛି ଶାଗୁଆନ୍ ପ୍ରକାରୀ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଉଚ୍ଚତା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇନଥିଲା । ଏହା ବେଶାଗଲା ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଆର୍ତ୍ତତା ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ଷ୍ଟାଣ୍ଡର୍ଡ ଟ୍ରେସ୍ ଶୋଲି ଯାଇନଥିଲା କିମ୍ବା ଅପ୍ରକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ଯଥା ଟ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଢାକୁ ସହ ପର୍ଯ୍ୟବ୍ଧିକୃତ ଭାବେ ଶୋଲି ଯାଇନଥିଲା । 56ଟି, 68.36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟୟ ସହ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିପାକ ହୋଇଥିଲା ।
- ବାର୍ତ୍ତା ଉଚ୍ଚ ବଞ୍ଚିବା ଭାବରେ ସୁନିଷ୍ଠିତ ନକରି, ବୃକ୍ଷରୋପଣର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାନୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଗୋଟିଏ କିଛିରେ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ପରିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିନା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରାକୃତିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ (ଏଏନଆର) କେ ବିକଳ ବୃକ୍ଷିଆ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାରିବର୍ଷର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅବଧି ପାଇଁ ବୋରଣ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟ ମାନାବର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅନୁପପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ 63.19 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିସାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।
- ପରିଷ୍ଟ ବୃକ୍ଷ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ସହରା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ସମାନ ଥିଲା, ସହରା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ମ୍ୟାନ ଟେକ୍‌କୁ ଅଧିକତର ଭାବରେ ଅଧିକ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ 39.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପରିସାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।
- ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ତଥା ବ୍ୟୟ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରାଯିବା ଫଳରେ 99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପରିସାର୍ଯ୍ୟ / ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।
- ସହରାଞ୍ଚଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଧିକରେ ବାଡ଼ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବିଚାର ବର୍ଷର ଉଷଣାବେଷଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ଅନିୟମିତ ଆବେଦନ ଯୋଗୁଁ 14.82 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଅନିୟମିତ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।
- ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଯେହେତୁ କେଉଁର ଆହ୍ୱାନ ନ କରି ଜଳସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ 69.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ରାଷ୍ଟ୍ରା ପ୍ରଶାସକରଣ ହେତୁ ଆଲୋକ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉତ୍ପର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଥିଲା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ଏବଂ ଅପ୍ରକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଯୋଗୁଁ ଷଡ଼ିଗ୍ରହ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସଂସ୍ଥାନୀକ(ସୁଏ) ଠାରୁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ।
- 40 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ କାନପିଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାର୍ତ୍ତା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକ ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା ହେତୁ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ କୃତ୍ରିମ ଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନଥିଲା ଏବଂ ଫଳସବୁରୁ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିପାକ ହୋଇଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି (ଓଇଏମ୍‌ଏଫ୍), ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଓଏଫ୍‌ଏସ୍‌ଡିପି), ନର୍ସିଂଗ୍‌ର ଯୋଜନା ନିୟମାବଳୀ (ଓଏମ୍‌ଆଇ), ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରେଣୀ ବିକାଶ ନିଗମ (ଓଏମ୍‌ନିଏଡିସି), ଓଡ଼ିଶା ବାଉଁଶ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଓବିଡିପି) ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ (ଆଇସିଜେଡ୍‌ଏମ୍‌ପି) । ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଓଏଫ୍‌ଏସ୍‌ଡିପି) ଏବଂ ଆଇସିଜେଡ୍‌ଏମ୍‌ପି ଯଥାକ୍ରମେ ଚାଷ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଉପକୂଳକର୍ମା ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବାହ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରକଳ୍ପ (ଇଏସି) ଅଟେ ।

2.1.1.2 ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବର୍ଗୀକରଣ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ² ତିନୋଟି ବ୍ୟାପକ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ଯଥା- ପୁନର୍ବିକରଣ, ବନାବଳୀ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଯାହା ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ।

- **ପୁନର୍ବିକରଣ:** -ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଅଛି ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିଭୂତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟର ବୃକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କିମ୍ବା ଅବିଧିଗତ କାଟିବା, ଗୋଟାଗଣ ତଥା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଭଳି ଜୈବିକ କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ବଳୟ ହରାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁନର୍ବିକରଣ ବନାବଳୀ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ ।
- **ବନାବଳୀ:** -ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ସମୟରେ (ଯଥା ଉପକୂଳ ବାଲୁକା କାନ୍ଥ) କିମ୍ବା ନିଜେ ଅତୀତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିଭୂତି ହୋଇନାହିଁ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁନର୍ବିକରଣ ଅପେକ୍ଷା ସାଧାରଣତଃ ଦ୍ରୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ କାରଣ ଏହା କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଗଯୁଗ ଧରି ଘଟିଆସୁଥିବା ପରିବେଶ ଅବନତିକୁ ଓଲଟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । କୃତ୍ରିମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ (ଏଆର୍) ହେଉଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଏହିପରି ଏକ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଠାରେ ବୃକ୍ଷର ବିକାଶ ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟ ନିଆଯାଏ ।
- **ସମୃଦ୍ଧ ବୃକ୍ଷରୋପଣ:** -ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୟମାନ ଫସଲରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରକାରର ଅନୁପାତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହିପରି ପ୍ରକାରକୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜେ ଅତୀତରେ ସଫା ହୋଇଥିବା ବେଳା କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀରେ, ବ୍ୟବଧାନରେ, ଗୋପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଅବନତି ହୋଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଶେଷାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ । ସହାୟକ ପ୍ରାକୃତିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ (ଏଏମ୍‌ଆର୍) ହେଉଛି ସମୃଦ୍ଧ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଏକ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଠାରେ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲର ଅବଶ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବଶ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଏହା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଗୀକରଣକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଭେନ୍ୟୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ମାଗ୍ନୋଲ୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ବାଉଁଶ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ସହଜା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

² ଉତ୍ସ: ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମାନ୍ୟତା, 1977 ର ଅନୁକ୍ରମ 3 ରୁ 6

2.1.1.5 ସମାକ୍ଷାର ପରିସର ଏବଂ ପଦ୍ଧତି

ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନଥିବାରୁ ଏବଂ ପଡ଼ିକା, ନଗର ହିସାବର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ, ବୃକ୍ଷରୋପଣର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ମାନବ ବିହୀନ ବିମାନ ଯାନ (ସୁଏଲି) ଏବଂ ବାହ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ମଇ 2019 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2021 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା (ପିଏ) ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ବୃକ୍ଷ ଗଣନା, ବୃକ୍ଷର ଉଚ୍ଚତା ମାପ, ପ୍ରକାରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ, କାନପି ଏବଂ ବୃକ୍ଷର ଘନତା ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଆର୍ଦ୍ରତା ସଂରକ୍ଷଣ ପରକ୍ଷେପ ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସା ଲଗାଇ ବିଭାଜନର ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ବାସ୍ତବିକ ଯାଞ୍ଚ (କେପିଭି) କରାଯାଇଥିଲା ।

2013-14 ରୁ 2017-18 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟୟକୁ ଆଧାର କରି ସ୍ତ୍ରୀ-ପୁଂ-ରାକ୍ଷମ୍ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା 49 ଟି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଜନ (ଯେହେତୁ ଏହି ବିଭାଜନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା) ମଧ୍ୟରୁ 13⁴ ଟିରେ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଏସ୍‌ଆର୍, ବାରିପଦାରେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହି ବିଭାଜନକୁ ନମୁନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ସେହିଭଳି, ବ୍ୟୟକୁ ଆଧାର କରି ରାଜ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା 11⁵ ଟି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ଅତିରୁ ପାଇଁ ଛଅଟି ଯୋଜନା ଚୟନ କରିବାକୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଡ଼୍ ବ୍ୟତୀତ, ଆଇସିକେଏମ୍‌ପି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନରେ ମାଗ୍ଗୋଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଜନ ଅଧିନରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିରୁ, ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ, ଏଏନ୍‌ଆର୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ 50 ହେକ୍ଟର ରୁ କମ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନ, ଏଆର୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ 20 ହେକ୍ଟର ରୁ କମ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନ, ଆରେନିୟୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ⁷ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଗନିଙ୍ଗ୍ ଜିଲୋମିଟର (ଆରକେଏମ୍) ରୁ କମ୍ ଏବଂ 10,000 ବିହନ ଥିବା ସହରା ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ବାଦ୍ ଦେଇଥିଲା, କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଚୟନ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଜନର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ, 50 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାନ ରେକ୍ସମ୍ ସାମ୍ପଲିଙ୍ଗ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଫ୍‌ଇ ଏବଂ ସିସି ବିଭାଗ, ପିସିଏଏଫ୍ (ଓ ଏବଂ ଏଏଏଏଏଏଏ), ପିସିଏଏଏଫ୍ (ଡବ୍ଲୁଏଲ୍), ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଓଏଏଏଏଏଏଏ), ପିଡି(ଓକିଡିଏ) ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ଏଫ୍‌ଆର୍‌ଏସ୍) ବିଭାଜନ, କଟକର ନଥିଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିରୁ, ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ।

ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ 22 ମଇ 2019 ରେ ଏକ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଅତିରୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । 22 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅତିରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସରକାରୀକ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଗିଫୋର୍ଟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ଅତିରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଅତିରୁକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁଚନା ଏବଂ ନଥିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅତିରୁ ବିଭାଗର ସହଯୋଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଏ ।

2.1.2 ଅତିରୁ ମାନଦଣ୍ଡ

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଧିନିୟମ, ନିୟମ ଏବଂ ନୀତିରୁ ଅତିରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର:

- ⁴ ବାମବା (ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ), ବରାକ୍ଷର, ଗୌଡ଼, କଳାକ୍ଷି (ଚଞ୍ଚିଟ), କେନ୍ଦୁଝର, କେନ୍ଦୁଝର (ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ), କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଚେତାଖୋଲ, ମାଗ୍ଗୋଇ ପରକ୍ଷେପ ବିଭାଜନ (ଏମ୍‌ଏଫ୍‌ପି) ରାଜନଗର, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
- ⁵ ଏସ୍‌ପି, ସିଏମ୍‌ପିଏ, ଏମ୍‌ଜି ଏନ ଆରକିଏସ୍, ଏନଟିଏମ୍, ଓଇଏମ୍‌ଏଫ୍, ଟିଏମ୍‌ଏଫ୍, ଏନ୍‌ଏସି, ଓକିଡିଏ, ସିଏସ୍‌ଆର, ଓଏମ୍‌ଡିଏଡିଏ ଏବଂ ଓକେପ୍‌ଆଇ
- ⁶ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା, ସିଏଏମ୍‌ପିଏ, ଏମ୍‌ଜି ଏନ ଆରକିଏସ୍, ଏନଟିଏମ୍, ଟିଏମ୍‌ଏଫ୍ ଏବଂ ଏନ୍‌ଏସି
- ⁷ ସଡ଼କ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ବରାପଥର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ଆରେନିୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରଣ କୃତ୍ୟାୟ, ପାଟଣା ପରିସରକୁ ଚଳିଙ୍ଗ୍ ଜିଲୋମିଟର (ଆରକେଏମ୍) ରେ ମାପ କରାଯାଏ

- ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ (ଓଏଫ୍‌ସି) ସଂହିତା, 1979, ଜଙ୍ଗଲ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମାନ୍ୟତା (ଏଫ୍‌ସିଏମ୍), 1977, ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରଣାଳୀ ସଂହିତା (ସିଏମ୍‌ସିପି), 1990 ଏବଂ ଜାତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ନୀତି (ଏନ୍‌ଏଫ୍‌ସି), 1988;
- ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ (ଓଜିଏଫ୍‌ଆର୍), ଓଡ଼ିଶା ରାଜକୋଷ ସଂହିତା (ଓଜିସି), କୃଷ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ (ଏଫ୍‌ଡି) ବିକ୍ଷେପରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା;
- ଭାରତର ଜଙ୍ଗଲ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ଏଫ୍‌ଏସ୍‌ଆଇ) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷେଡ୍ ଅଫ୍ ଫରଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟସ୍ (ଆଇଏସ୍‌ଏଫ୍‌ଆର୍), ପ୍ରକୃତ ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମୂଲ୍ୟ ମାନାଦର୍ଶ;
- କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଡବ୍ଲୁପି)/ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ସିଏସ୍‌ମସିଏ ଦାର୍ଶନିକ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା (ଏପିଓ); ଏବଂ
- ସରକାର/ ପିସିସିଏଫ୍ / ମହୁରା ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ବାସ୍ତବିକ/ ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ / ଆଦର୍ଶ ।

ଅତିର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

2.1.3 ଜଙ୍ଗଲ ନୀତି ଏବଂ ଯୋଜନା

2.1.3.1 2013-14 ରୁ 2017-18 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ସ୍ଥିତି

2013-14 ରୁ 2017-18 ଅତିର୍କ ଅବଧି ପାଇଁ ସିଏସ୍‌ମସିଏ ଅଧିନରେ କରାଯାଇଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବ୍ୟତୀତ, ରାଜ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବାସ୍ତବିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାରଣୀ 2.1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ।

ସାରଣୀ 2.1: ବୃକ୍ଷରୋପଣର ବାସ୍ତବିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି

ବର୍ଷ	ଏଆର୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ (ହେକ୍ଟରରେ)	ଏଏନ୍‌ଆର୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ (ହେକ୍ଟରରେ)	ଆଭେନ୍ୟୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ (ଆର୍କେଏମ୍)	ସରକାରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ (ଚାଲା ଲାଗରେ)	ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ (କୋଟିରେ)
2013-14	25,086	38,050	4,506	10.57	196.63
2014-15	24,600	60,253	4,755	14.90	226.75
2015-16	16,576	98,540	4,607	15.65	298.87
2016-17	15,322	1,27,973	5,588	13.90	349.75
2017-18	5,776	20,367	3,235	11.15	104.14
କମ୍ପାଏ	87,360	3,45,183	22,691	66.17	1,176.14

(ଏ ଆର : ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମ ପ୍ରକରୁ ତାହା, ଏ ଏଫ୍ ଆର: ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରକରୁ ତାହା (ଉତ୍ତମ-ଓଫ୍ ପ୍ରତିନେତାଙ୍କ ଅନୁକ୍ରମ -2.1.1.2 - ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନୀତିରେ)
(ଲକ୍ଷ: ଏଫ୍ ଏବଂ ଲ ବିଭାଗ ଏବଂ ସିଏସ୍‌ମସିଏ (ଓ)/ ନିଏଫ୍‌ସି ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରିପୋର୍ଟ)

ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁସାରେ ଏଆର୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥିର ହ୍ରାସ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଏନ୍‌ଆର୍ ଏବଂ ଆଭେନ୍ୟୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ 2013-14 ରୁ 2016-17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । କମ୍ ବ୍ୟୟ ହେତୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବର୍ଷ 2017-18 ରେ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ।

2.1.3.2 ଚୟନ ହୋଇଥିବା ବିଭାଜନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ସ୍ଥିତି

ରାଜ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟରୁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା 13 ଟି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଜନର ସ୍ଥିତି ସାରଣୀ 2.2 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.2: ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଜନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ସ୍ଥିତି

ବର୍ଷ	ଏଆର୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ (କେନ୍ଦ୍ରରେ)	ଏଏଆର୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ (କ୍ଷେତ୍ରରେ)	ଆକାଶ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ (ଆକାଶ୍ୟ)	ଘନା/ ବୃକ୍ଷରୋପଣ (କୋରା ଲକ୍ଷରେ)	ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ (କୋଟିରେ)
2013-14	6,752	11,965	1,040	2.03	60.55
2014-15	6,068	18,835	1,292	3089	81.06
2015-16	7,580	31,082	1,389	4.36	107.39
2016-17	5,738	46,684	1,916	2.78	150.21
2017-18	2,842	8,582	1,262	1.41	41.49
ମୋଟ	28,980	1,17,148	6,899	14.47	440.70

(ଉତ୍ସ: ବିଭାଜନୀୟ ସୂଚନାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି)

2.1.3.3 ଚୟନ ହୋଇଥିବା ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ପ୍ରକଳ୍ପ-ଓଡ଼ିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ

ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ (ଏଫ୍‌ଇ ଆକ୍ସ ସିସି) ବିଭାଗକୁ ବାଚାମାର ଅନୁରୋଧ କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ-ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ, ଉଭୟ ବାସ୍ତବିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ହିସାବ କଥା ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । 2013-18 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇଛି ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇ ସାରଣୀ 2.3 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.3: ଚୟନ ହୋଇଥିବା ବିଭାଜନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ-ଓଡ଼ିଆ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ସଫଳତା

ବୃକ୍ଷରୋପଣ	କର୍ମ ସଂଖ୍ୟା	ସଫଳତା	କର୍ମ ସଂଖ୍ୟା	କର୍ମ ସଂଖ୍ୟା	କର୍ମ ସଂଖ୍ୟା	କର୍ମ ସଂଖ୍ୟା	କର୍ମ ସଂଖ୍ୟା	କର୍ମ ସଂଖ୍ୟା
ଏଆର୍ (କେନ୍ଦ୍ର)	10,158	4,296	8,029	1,596	47	494	240	24,860
ଏଏଆର୍ (କ୍ଷେତ୍ର)	8,485	63,166	39,888	50	0	645	0	112,234
ଆକାଶ୍ୟ (ଆକାଶ୍ୟ)	871	50	5,488	0	0	0	0	6,409
ଘନା (କୋରା ଲକ୍ଷରେ)	12.85	0	0	0	0.48	0	0	13.33

(ଉତ୍ସ: ବିଭାଜନୀୟ ସୂଚନାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି)

2.1.3.4 ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନାରେ ଅଭାବ

ଏନ୍‌ଏଫ୍‌ସି, 1988 ର ଅନୁକ୍ଳେବ 4.14 ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସମ୍ପାଦିତ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚାଳନାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଶେଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟର ସାମୟିକ ସଂଗ୍ରହ, ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ ଉନ୍ନତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଓଏଫ୍‌ସି ସଂହିତା, 1979 ର ନିୟମ 21 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଡିଏଫ୍‌ଓ, ବାକି ଭଳ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିଜ ବିଭାଜନରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସଠିକତା ପାଇଁ ଦାୟା ରହିବେ ।

2013-14 ରୁ 2017-18 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବାସ୍ତବିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାରଣୀ 2.4 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.4: ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବାସ୍ତବିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ବର୍ଷ	ଏଆର୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ		ଏଏଆର୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ		ଘନା ଧାର୍ଯ୍ୟ (କୋରା)	ଘନା ଲକ୍ଷ୍ୟ (କୋରା)	ଅଧିକ (+) / ଅଧିକ (-) (କୋରା)	ଆକାଶ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ		କର୍ମ (+) / କର୍ମ (-) (କୋରା)				
	ଧାର୍ଯ୍ୟ (କୋରା)	କର୍ମ (କୋରା)	ଧାର୍ଯ୍ୟ (କୋରା)	କର୍ମ (କୋରା)				ଧାର୍ଯ୍ୟ (କୋରା)	କର୍ମ (କୋରା)					
2013-14	40,000	25,086	40,000	38,050	80,000	63,136	16,864	4,000	4,506	-506				
2014-15	27,252	24,600	49,196	60,253	76,448	84,853	-8,405	5,015	4,755	260				
2015-16	24,002	16,576	1,95,584	98,540	2,19,586	1,15,116	1,04,470	5,440	4,607	833				
2016-17	25,417	15,322	2,12,529	1,27,973	2,37,946	1,43,295	94,651	5,941	5,588	353				
2017-18	19,683	5,776	2,47,042	20,367	2,66,725	26,143	2,40,582	5,383	3,235	2,148				
ମୋଟ	1,36,354	87,360	7,44,351	3,45,183	8,80,705	4,32,543	4,48,162	25,779	22,691	3,088				
							କର୍ମର ସ୍ଥିତି				50.89			11.98

(ଉତ୍ସ: ବିଭାଜନ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିମନ୍ତେ)

2013-14 ରୁ 2017-18 ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଧିନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ 11.98 ରୁ 50.89 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା । ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନମତେ ଥିଲା:

- ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଯଥା ରେଖ, ବିଭାଜନ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅବକ୍ଷୟ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଜମି ସମକ୍ଷରେ କୌଣସି ବିସ୍ତୃତ ତାଟାବେସ୍ ନଥିଲା । ଯୋଜନା ପ୍ରଣାଳୀ କେବଳ କ୍ଷେତ୍ରାୟ ଜମିଗାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ଭାଗ କରି ପ୍ରଦତ୍ତ ଚତୁଃଶାତ୍ ଚର୍ଯ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା ।
- ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଜମିରେ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରେଖ ଏବଂ ବିଭାଜନ ସ୍ତରରେ ସଂକଳନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପିସିସିଏଫ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ରେଖ, ବିଭାଜନ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ।
- ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳତା ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଯୋଜନା (ସିଏସ୍ପି) ଅଧିନରେ ଥିଲା । ଉଚ୍ଚାନ୍ତରଣ ସବୁଠାରୁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମ୍ପ୍ଲିଏମ୍‌ଆରଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ କମ୍ପୂଟି 23 ରୁ 68 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ଯାହା ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.4.4 ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଜନନଗୁଡ଼ିକର ଅନୁମୋଦନରେ ବିଳମ୍ବ, ଜର୍ କାର୍ତ୍ତଧାରା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା, ସମୟାନୁଯାୟୀ ପାଣି ପ୍ରଦାନ କରାନଯିବା ଏବଂ କମ୍ ବେତନ ହାର ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ।

ତେଣୁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ କୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଯ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ନିଜଟିରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

ଅତିରିକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସାକାର କରି ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଖାଲି ଜମି ଚର୍ଯ୍ୟ ଅବକ୍ଷୟ ଜମିର ଉପଲବ୍ଧତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭାଜନ ଠାରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରସାର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ ବିଭାଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ପ୍ରସାର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତଥ୍ୟ ବିଭାଜନ ଏବଂ ପିସିସିଏଫ୍ (ଓ ଏବଂ ଏନ୍‌ଓଏଫ୍‌ଏଫ୍), ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ତ୍ତୁଳ କୌଣସି ନଥି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିନଥିଲେ ।

2.1.3.5 ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ନୀତି ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା


ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସମ୍ପଦର ନିରନ୍ତର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏନ୍‌ଏଫ୍‌ପି, 1988 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ନୀତି (ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ପି) ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ କମିଶନ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2006) ।

ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଳା ଯେ ବିଭାଗ ସପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ପି ଗଠନ କରିନାହିଁ । ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ପି ଗଠନ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଳୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ, ଯଦିଓ ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ପି ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ଏହା ବଦଳରେ ଏନ୍‌ଏଫ୍‌ପିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଏନ୍‌ଏଫ୍‌ପି, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗାଇଡ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଅଟେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂ-ଜଳବାୟୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଏନ୍‌ଏଫ୍‌ପି ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ, ନିଜସ୍ୱ ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ପି ଗଠନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

2.1.3.6 କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଏହିପରି ଯୋଜନା ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଗତ ସଂଖ୍ୟା.3

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିଚେଷ୍ଟ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ମହାଲକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଏନ୍‌ଡ୍ରୁପି) ସଂହିତା 2014 ର ଅଧ୍ୟାୟ 1 ର ଅନୁକ୍ରମ 3 ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା/ ପ୍ରକଳ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ଅନୁଯାୟୀ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବା କଥା । ପୁନଶ୍ଚ, ଏନ୍‌ଏପି, 1988 ସଂସ୍କରଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେ ଉଚିତ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ବିନା କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଡ୍ରୁପି) / ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିଚାଳନା ଜିମା ମାଲିକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରୁପିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଜନରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲର ସର୍ବତ୍ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତି ବନ ବର୍ଷରେ ଥରେ ସଂଶୋଧିତ ହେବ । ବେସରକାରୀ, ଗ୍ରାମ ଇତ୍ୟାଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ/ ମାଲିକାନା ଅଧିନରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଜିମା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଡ୍ରୁଏସ୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା ।

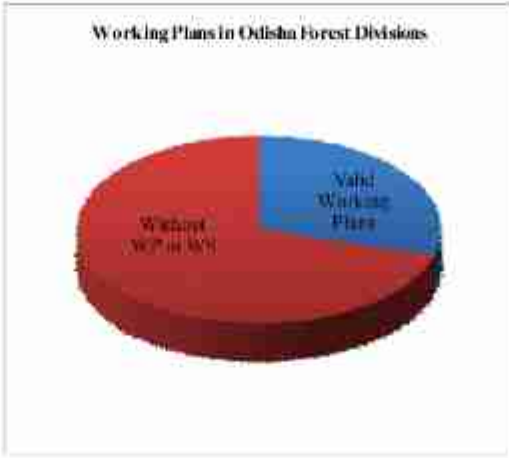

ଅତିକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 44 ବିଭାଜନ ଯଥା 37 ବୈଦିଗ୍ୟୋଗିଆଲ୍ ଏବଂ 7 ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବିଭାଜନ ବିଧିମାନ୍ୟ ଡ୍ରୁପି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଏହା କ୍ଷମ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 44 ବି ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 13 ବି ବିଭାଜନ ଅନୁମୋଦିତ ଡ୍ରୁପି ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, 27 ବି ବିଭାଜନ ଅନୁମୋଦିତ ଡ୍ରୁଏସ୍ ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧି ବିଭାଜନ କୌଣସି ଅନୁମୋଦିତ ଡ୍ରୁପି/ ଡ୍ରୁଏସ୍ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେନ୍ନାଇ ଯେ, 27 ବି ବିଭାଜନର ଡ୍ରୁଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାଂଶ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, 31 ବି ବିଭାଜନ ଅନୁମୋଦିତ ଡ୍ରୁପି/ ଡ୍ରୁଏସ୍ (ଜୁନ୍ 2021) ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଯାହା ପରିଶିଷ୍ଟ-1 ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି । ବିଧିମାନ୍ୟ ଡ୍ରୁପି/ ଡ୍ରୁଏସ୍ ବିନା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏନ୍‌ଡ୍ରୁପି ସଂହିତା, 2014 ର ମୌଳିକ ନୀତିକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବୈଦିଗ ବିଦିଗର ନିରନ୍ତର ପରିଚାଳନାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲା ।

ସମାପ୍ତ ସିକାନ୍ତକୁ ସାକାର କରି ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ 2020-21 ରେ 10 ବି ଡ୍ରୁପି ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2021-22 ରେ 20 ବି ଡ୍ରୁପି ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି 2021-22 ରେ 10 ବି ଡ୍ରୁଏସ୍ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ।

2.1.3.7 ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଲ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନହେବା

ଏନ୍‌ଡ୍ରୁପି ସଂହିତା, 2014 ର ଅଧ୍ୟାୟ VI ର ଅନୁକ୍ରମ 76 ଅନୁଯାୟୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଷୟରେ ଏକ ଅଧ୍ୟାଧୁନିକ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ । ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଏହାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସର୍ବେକ୍ଷଣର ପନାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପରିକାଳେ କିପରିକି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଓଏପି ସଂହିତା, 1979 ର ନିୟମ 227 ଅନୁଯାୟୀ, ଜଙ୍ଗଲ ସଂପଦର ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚାମାଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ବାଦିଆ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଲ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ଏଫ୍‌ଆର୍‌ଏସ୍) ବିଭାଜନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା (1970) । ଓଏପି ସଂହିତାର ନିୟମ 228 ଏବଂ ନିୟମ 233 ଅନୁଯାୟୀ, ଉଚ୍ଚ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ଏକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଯୋଜନା (ଏସ୍‌ଏପି) ସମ୍ପଲ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଟିଏଫ୍‌ଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସଂରକ୍ଷକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ବାର୍ଷିକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳି (ଏଏ) ଗଠନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଲ ଉପରେ ଏକ ବାର୍ଷିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଗିଫୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା କଥା ।

ଅତିରିକ୍ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିଭାଜନର ନଥିବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନିୟମିତତା ଅବଲୋକନ କଲା:

- ❖ ଉପରୋକ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ଏଫ୍/ଆର୍/ଏସ୍ ବିଭାଜନକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । 2009-10 ପରେ ଏସ୍/ପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା । ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା 2015-16 ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଜନର ତତ୍ତ୍ୱପିତ୍ୱ ପୁନଃଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିଭାଜନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ତତ୍ତ୍ୱପିତ୍ୱ ବିଭାଜନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧିକାରୀ (ତତ୍ତ୍ୱପିତ୍ୱ) କି ଦ୍ୱାରା ତତ୍ତ୍ୱପିତ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା କଥା ।
- ❖ 2013-16 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କୌଣସି ପାଣ୍ଠି ଆବେଦନ ହୋଇନଥିଲା । ବିଭାଜନରେ 38 ରୁ 42 କର୍ମଚାରୀ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବା ବୁଲନ୍ତରେ 22 ରୁ 31 କର୍ମଚାରୀ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ଏବଂ 2013-18 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ 4.89 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 2016-18 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 11.56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ, ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବ୍ୟୟ ବିଭାଜନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ।

ଅଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ବେତନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଏହି ବିଭାଜନର ଅଣକାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଜାରଣ ଥିଲା ।

ଅତିରିକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସାକାର କରି ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଜନର ତତ୍ତ୍ୱପିତ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଏହି ବିଭାଜନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବିଭାଜନର ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇନପାରିଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ତତ୍ତ୍ୱପିତ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦାରିତ ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଏହା ଏକ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ।

ସୁପାରିଶ (ଜଙ୍ଗଲ ନୀତି ଏବଂ ଯୋଜନା)

- ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଜ ବନସ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କର ନିରନ୍ତର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ।
- ସମସ୍ତ ସ୍ତର ଯଥା-ରେଖ, ବିଭାଜନ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଏବଂ ଶାଲି ରାଜସ୍ୱ ଜମି ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଚାଟାବେସ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ସରକାର ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ।
- ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସମନ୍ୱିତ ଯୋଜନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରେ ।
- ରାଜ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲର ନିରନ୍ତର ପରିଚାଳନା ଏବଂ କୈବ ବିବିଧତା ପାଇଁ ବିଭାଜନର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ବିଧିମାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ।

2.1.4 ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାବହାର

2.1.4.1 ପ୍ରଜାତି ଗୁଡ଼ିକର ଅନିୟମିତ ବ୍ୟୟ

ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଭିଦଗାଳିତ ମୌଲିକତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନକରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା/ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଜାତିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ ସହିତ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଧିକାର୍ୟ ଦିଆଯିବ । ପୁନଶ୍ଚ, ଅତିରିକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକର ତତ୍ତ୍ୱପିତ୍ୱ/ ତତ୍ତ୍ୱସ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଶାଳ

ଗଠିତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ । ପିସିସିଏସ୍ ସର୍ବିଲର (ଅକ୍ଟୋବର 2018) ମଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଶାଗୁଆନ, ଆକାସିଆ ଏବଂ ଇଉକାଲିପଟାସ ଗଠିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲଗାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ନାନାଣ ଏହି ପ୍ରକାଶିତଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ।

- ଅତିବ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପତ୍ରିକା, ଡବ୍ଲୁପି/ ଡବ୍ଲୁଏସ୍ ଏବଂ ବସନ ହୋଇଥିବା ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ପରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ବସନ ହୋଇଥିବା 13 ଟି ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଟିରେ 2013-18 ଅବଧିରେ ସହାୟକ ପ୍ରାକୃତିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ (ଏଏନଆର) ଅଧିନରେ 73,692.46 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ହୋଇଥିବା 926 ଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ଶାଳ ପ୍ରକାଶି ଉପରେ ଶାଗୁଆନ ପ୍ରକାଶିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ରେକଂଗୋଲ ବିଭାଜନରେ ସମୁଦାୟ 173.81 ଲକ୍ଷ ବିହନ ମଧ୍ୟରୁ, 67.53 ଲକ୍ଷ ଶାଗୁଆନ (36 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ କେବଳ 3,000 ଶାଳ (0.02 ପ୍ରତିଶତ) ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ବଳତା 106.25 ଲକ୍ଷ ବିହନ ଆମଳା, ସିମାରୁଡା, ଗମାରା, କରଞ୍ଜ, ଶିଶୁ, କାଜୁ, ବାଉଁଶ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ରାଜନଗର (ଏଏନଆର) ବିଭାଜନ ଅଧିନରେ ଏଏନଆର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାହିଁ କରାଯାଇନଥିଲା । କେବଳ ସତେଶା ପ୍ରକାଶି ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ବିଭାଜନ ଗୁଡ଼ିକର ଡବ୍ଲୁପି/ ଡବ୍ଲୁଏସ୍ର ଏହା ଏକ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଥିଲା ।
- ବୈଦିକ ଲଗାଲ ବିଭାଜନରେ 2013-14 ଅବଧିରେ ପୁରୁଣା କଟକ ରେଞ୍ଜ ଅଧିନରେ ଥିବା କାମୁନାଥପୁରରେ 10 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜମିର ବାସ୍ତବିକ ଲକ୍ଷଣ ଯଥା-ବୃକ୍ଷପାତ/ ତାପମାତ୍ରା ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୂଳିକା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପତ୍ରିକାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇ ନଥିବା ଅତିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏଫ୍.ପି.ଏମ୍.ର ନିୟମ 207 ଅନୁଯାୟୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ସ୍ଥିତି, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବଞ୍ଚେଇବା ଶକ୍ତିକୁ ସମଲିତ ଆରଖଣ ଚିତ୍ରାମାନ ଯାଞ୍ଚ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ପତ୍ରିକା ଅନୁଯାୟୀ 4,000 ଶାଗୁଆନ, 4,000 ଶିଶୁ ଏବଂ 3,000 ବାଉଁଶ ଏହିପରି ମୋଟ 11,000 ବିହନ ବୁଣାଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ବାସ୍ତବିକ ଯାଞ୍ଚ (କେପିଭି) ସମୟରେ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଛଅ ବର୍ଷର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପରେ ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା 12 ରୁ 15 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ହାରାହାରି 80 ପ୍ରତିଶତ ବଞ୍ଚେଇ ସହିତ ଦୁଇଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଛୁଣ୍ଟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚେ ରହିଥିଲା । ଯେହେତୁ ଜରୁରୀକାଳିନ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ସମୟରେ କେବଳ ଶାଗୁଆନ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଉଭୟ ଶିଶୁ ଏବଂ ବାଉଁଶ ଗଛକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ, ବୃକ୍ଷର ହାରାହାରି ବଞ୍ଚେଇ 37 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ତାବଳୀ ଏହା ସାଧ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମୂଳିକା, ବୃକ୍ଷପାତ, ତାପମାତ୍ରା, ହେନେକ୍ ସିଦ୍ଧମ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକାଶିର ବସନ ଅନୁପସ୍ତୁତ ଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ସରୁକ ବଳୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳବାୟୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରକାଶିର ବଞ୍ଚେଇବା ହାରକୁ ଆଧାର କରି ବସନ କରାଯାଇଥିଲା । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଭୁ-ଜଳବାୟୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକର ଡବ୍ଲୁପି/ ଡବ୍ଲୁଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର କେବଳ ବିବିଧତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସତେଶା ପ୍ରକାଶିଗୁଡ଼ିକୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

2.1.4.2 ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପସ୍ତୁତ ଅନୁରକ୍ଷଣ

ଏଫ୍.ପି.ଏମ୍, 1977 ର ନିୟମ 197 ଏବଂ 201 ଅନୁଯାୟୀ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ରେକର୍ଡିଂ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପତ୍ରିକା ଯଥାକ୍ରମେ ପରିଶିଷ୍ଟ-XI ଏବଂ XII ରେ ବିଭାଗ ତଥା ରେଞ୍ଜ ସ୍ତରରେ ଅନୁରକ୍ଷଣ କରାଯିବ । ଏହି ପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ନକଲ ସର୍ବିଶା ଅପ୍ଡେଟ୍ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ବିଶା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ବୃକ୍ଷ ଲଗାଯିବ ଦିନ ଠାରୁ ଲଗାତାର ଚିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସର୍ବିଶା/ ହାରାହାରି

ଉଚ୍ଚତା, ବଞ୍ଚିବାର ଶକ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଅବସ୍ଥା, ବିଭାଜନ ତଥା ରେଞ୍ଜ
ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପତ୍ରିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ।

ବୟନ ହୋଇଥିବା 13 ଟି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଜନରେ ନଥିପତ୍ର ପାଞ୍ଚ କରି ସମାପ୍ତ ହେବାରୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା
ଅଧିନରେ ସମୁଦାୟ 4,586 ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ, 2013-14 ରୁ 2017-18 ସମ୍ପର୍କିତ
312 ଟି (07 ପ୍ରତିଶତ) ପତ୍ରିକା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଅତିବୃକ୍ଷ ଯାଞ୍ଚ
ପାଇଁ ବାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା । 4,586 ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟରୁ 2,373 ପତ୍ରିକା ନମୁନା
ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ମନୋନୀତ ପତ୍ରିକାର 50 ପ୍ରତିଶତ
ଅର୍ଥାତ୍ 1,187 ଟି ପତ୍ରିକାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ 148
ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପତ୍ରିକା (12.47 ପ୍ରତିଶତ) ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଯାହା ପରିଶିଷ୍ଟ-2
ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି । ବୃକ୍ଷରୋପଣର ପୂର୍ବ ଏବଂ ପର ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ, ବିବରଣୀ ସହ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ଷିକ ବ୍ୟୟ,
ରେଞ୍ଜ ଅର୍ଥସରକାର ଚିତ୍ରିତ ଯାଞ୍ଚ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ (ଫରେଷ୍ଟର/ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ) ଏବଂ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାମାଣିକିକରଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପତ୍ରିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଯେହେତୁ ଏକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ
ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକରେ
ଅନୁରକ୍ଷଣ କରାଯାଇନଥିଲା, ଅତିବୃ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ପ୍ରାମାଣିକରଣ କରିପାରି ନଥିଲା ।

ଅତିବୃ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଗୃହଣ କରି ସରକାର ପ୍ରକାଶ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ ଯେହେତୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ
ସମୟ ସାମିତ ଥିଲା ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା, ଯୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ରେକର୍ଡ
ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ, ପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ।

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ

2.1.5 ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ

ଆର୍ଥିକ ଦର୍ଷରେ ଶହେ ବିନର ଦେତନ ଚୋରଗାରର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବୟସ୍କ ସର୍ବସାମାନ୍ୟ
ପେଡ଼ିମାନେ ଅଣାକୁଶଳା ହସ୍ତଚାଳିତ କାମ ସେଞ୍ଚାକୃତ ଭାବେ ରେଡି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା
ହେଉଛି ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଓଡ଼ିଶାରେ 2006 ମସିହା ଠାରୁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ହେଉଛି । ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
କରାଯାଇଥାଏ ।

ପଞ୍ଚାୟତ୍‌ରାଜ (ପିଆର୍) ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ 2014-15 ରେ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନା ସହିତ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଫ୍‌ଇ
ଏବଂ ସିସି ବିଭାଗ ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ
ସହ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ଶାଳ ଖୋଳିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ । ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରାଧିକରଣ
(ଟିଆର୍‌ଡିଏ) ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଧାସଳଖ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ
କରିଥାନ୍ତି ।

2.1.5.1 ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ

ପିସିସିଏସ୍ (ଓ ଏବଂ ଏଓଏଫ୍‌ଏସ୍) ଏବଂ 2013-14 ରୁ 2016-17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ବିଭାଗର ବାର୍ଷିକ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନୁମୋଦିତ ପାଣ୍ଠିର ବିନିଯୋଗ
ଏବଂ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ କରାଯାଇଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସାରଣୀ 2.5 ରେ ବିସ୍ତୃତ
ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା, 2017-18 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ
ସମକ୍ଷାୟ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା କିମ୍ବା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅତିବୃକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଫାଟା 2.5: ଅନୁମୋଦିତ ପାଣ୍ଠିର ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ

ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବର୍ଷ	ପାଣ୍ଠି (ଲକ୍ଷ ଡଲାର୍)		ଏହାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ (ହେକ୍ଟର)		ଏହାଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷରୋପଣ (ହେକ୍ଟର)		ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ (ହେକ୍ଟର)	
	ଅନୁମୋଦିତ	ବିନିଯୋଗ	ଅନୁମୋଦିତ	ବିନିଯୋଗ	ଅନୁମୋଦିତ	ବିନିଯୋଗ	ଅନୁମୋଦିତ	ବିନିଯୋଗ
2013-14	13,557.09	6,661.12	25,782	8,313	30,757	29,774	3,000	3,506
2014-15	18,181.25	6,749.54	4,195	3,596	31,745	36,308	4,015	3,755
2015-16	14,134.99	8,056.32	10,117	2,109	29,330	26,245	4,138	3,340
2016-17	14,646.88	8,838.92	3,000	913	25,000	16,893	4,000	3,714
ଟୋଟାଲ	60,520.21	30,305.9	46,094	14,931	1,41,832	1,09,220	19,153	14,315
କମ୍ପୂରଣ ପ୍ରତିଶତ	50		68		23		25	

(ଉତ୍ସ: ବିଭାଗର ବର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ଉପରୋକ୍ତ ଫାଟାଟିରୁ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଯେ 50 ପ୍ରତିଶତ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାରେ କମ୍ପୂରଣ 23 ରୁ 68 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ 1977 ର ନିୟମ 130(b) ଅନୁଯାୟୀ, ନିୟମିତ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଚାଚା ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଦାଖଲ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ଉତ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ତତ୍ପରେ ହୋଇଥିବା ବିଭାଜନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ଅତିର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲା:

- ❖ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ 527 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସାର ପାଞ୍ଚଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ବିନିଯୋଗ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଲ ରୁ ଲୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତିନି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରାଧିକାରଣ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ବର୍ଷର ଲୁଲାଇ/ ଅଗଷ୍ଟରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ବିନିଯୋଗ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯଥା- 2013-14, 2015-16 ଏବଂ 2017-18 ମଧ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉତ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ 95ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦାଖଲ କରାଯାଇ ଯାହା ଡିଆରଟିଏ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା । ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଡିଆରଟିଏ ମଧ୍ୟରେ ତଥା ବିଭାଜନ ସମୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜବ୍ କାର୍ଡ୍‌ଧାରୀଙ୍କ ଉପଲକ୍ଷରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ ଏହି କମ୍ପୂରଣ କାରଣ ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।
- ❖ ଡିଆରଟିଏ ଦ୍ୱାରା ଯଦିଓ ପାଣ୍ଠି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଭାଜନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲକ୍ଷ ଥିବା ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରି ନଥିଲେ ।
- ❖ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଜନ-ଦ୍ୱାରା ଜବ୍ କାର୍ଡ୍‌ଧାରୀଙ୍କ ଉପଲକ୍ଷରେ, ପିସିସିଏସ୍ (ଓ ଏବଂ ଏଡ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍)ଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଲକ୍ଷ ନଥିଲା ।
- ❖ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲିଏମେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଡିଆରଟିଏ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ସର୍ବମୋଟ ମ୍ୟାନଡେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଯଦିଓ ଜବ୍ କାର୍ଡ୍‌ଧାରୀ ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ଉପଲକ୍ଷ ଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଏହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା । ମ୍ୟାନଡେଡ୍ ଉପଯୋଗ ଉପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁକ୍ରମ 2.1.4.5 ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

⁸ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଗାମ୍ଭୀରୀ (92), କୋର (61), କେନ୍ଦୁଝର (100), ରାୟଗଡ଼ା (215) ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ (159)
⁹ କୋର (2015-16 = 12 ଏବଂ 2017-18 = 10), କେନ୍ଦୁଝର (2013-14 = 20) ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା 2017-18 = 53)

ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ ତିଆରିବିଏ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନରେ ବିଳମ୍ବ, ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ କାର୍ତ୍ତାଧାରା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ଏବଂ ଜମ୍ ବେତନ ହାର ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଉଭୟ ଗୃହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଏହା ଉପରୋକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ ଜଳ କାର୍ତ୍ତାଧାରା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମୋଦିତ ମ୍ୟାନୁଡେଜମେଣ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଦିଏଫ୍‌ଓମାନେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ବିଳମ୍ବରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ତିଆରିବିଏ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଯେହେତୁ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ଦିଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଧାରରେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନରେ ବିଳମ୍ବ ଠିକ୍ ମନେ ହେଉନାହିଁ । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଜୁରୀ ହାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମୂଖ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ ।

2.1.5.2 ମ୍ୟାନୁଡେଜ୍ ଉପଯୋଗରେ ଅଭାବ

ବୟନ କରାଯାଇଥିବା ବିଭାଜନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ମ୍ୟାନୁଡେଜ୍ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ଉପଯୋଗର ସ୍ଥିତି¹⁰କୁ ଅତି କ୍ଷମା ଦିଶୁଥିବା ଜରିଥିଲା । ଅତି କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ ତିଆରିବିଏ ଗୁଡ଼ିକକୁ ପ୍ରାକ୍‌ଜିକ୍ ମ୍ୟାନୁଡେଜ୍ ମଞ୍ଜୁର ଏବଂ ଉପଯୋଗ ବ୍ୟୟ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଅତି କ୍ଷମା ଲାଭା ଯେ 2013-18 ମଧ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସମ୍ପେଡ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବୟନ କରାଯାଇଥିବା 13ଟି ବିଭାଜନକୁ ମୋଟ 98.93 ଲକ୍ଷ ମ୍ୟାନୁଡେଜ୍ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2,013 ଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା 5,100 ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କେବଳ 51.04 ଲକ୍ଷ ମ୍ୟାନୁଡେଜ୍ (51.58 ପ୍ରତିଶତ) ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକରେ ମ୍ୟାନୁଡେଜ୍ ଉପଯୋଗର ପ୍ରତିଶତ 15 ରୁ 96 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ।

13 ଟି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟରୁ ସାତଟି ବିଭାଜନରେ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବିନିଯୋଗ ଉପରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ସାରଣୀ 2.6 ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ।

ସାରଣୀ 2.6: ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ମ୍ୟାନୁଡେଜ୍ ଉପଯୋଗ

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଜନର ନାମ	ଆବଣ୍ଟିତ ସମସ୍ତା		ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ(କେବଳ ଉଷ୍ଣରେ)		ପାଣ୍ଠିର ବିନିଯୋଗରେ ଅଭାବର ପ୍ରତିଶତ [(5-6)/5 x 100]	ମ୍ୟାନୁଡେଜ୍ (ଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍)		
		ହେତୁକ	ଆବଣ୍ଟିତ ଏମ୍	ଆବଣ୍ଟିତ	ବିନିଯୋଗ		ପୂର୍ଣ୍ଣ	ଅନୁପାତ [(8/10) x 7]	ଉପଯୋଗ ମ୍ୟାନୁଡେଜ୍ ପ୍ରତିଶତ [(100 - (7))]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ବନଜା ଚକ୍ରପୁର	1,100	271	483.76	305.82	36.78	1,13,345	65,949	63.22
2	ଜୋରାସୁଡ଼	3,290	263	1210.13	673.07	44.38	2,29,453	1,83,086	55.62
3	କେନ୍ଦୁଝର	4,883	472	1936.96	950.30	50.94	2,90,053	3,01,151	49.06
4	କୋଟି	1,941	302	994.79	443.34	55.43	1,54,385	1,92,032	45.47
5	ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	5838	455	2186.24	1120.47	48.75	269254	256109	51.25
6	ମାଲକାନଗିରି	2020	195	799.76	435.15	45.59	205249	171977	54.41
7	ଭାଗଲକୋଟା	7030	613	2446.43	1905.56	22.11	805183	228541	77.89
	ମୋଟ	26105	2575	10063.07	5839.71		2066930	1398854	

ଉତ୍ସ: ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଏଫ୍‌ଓ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ 2013-18 ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ବିନିଯୋଗରେ ଅଭାବ 22.11 ରୁ 55.43 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପେଡ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବିଭାଜନ ଗୁଡ଼ିକ 48,47,471 ମ୍ୟାନୁଡେଜ୍ ମଞ୍ଜୁର ନେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦିଏଫ୍‌ଓମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ମ୍ୟାନୁଡେଜ୍ ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ମ୍ୟାନୁଡେଜ୍‌ର 45.47 ରୁ 77.89 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିଥିଲେ । ଏହା ଦିଏଫ୍‌ଓମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ

¹⁰ ଦିଏସିଏଫ୍, ଓଡ଼ିଶା ପରିଶିଷ୍ଟ III ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତା ପାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି

କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଯୋଜନା ଅଭାବ ଥିବା ଦର୍ଶାଇଲା । ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଭାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ମ୍ୟାନୁଡେଜର ଉପଲବ୍ଧ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଡିଏଫ୍ ଓ ମାନେ ଡିଆର୍କ୍ଟିଏ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିନଥିଲେ ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା, କମ୍ ବେତନ ହାର ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଅନୁମୋଦନରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ମ୍ୟାନୁଡେଜରେ ଅଭାବ ଥିଲା । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଡିଆର୍କ୍ଟିଏ ଦ୍ୱାରା ଡିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭାଜନରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଭାଜନ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ମ୍ୟାନୁଡେଜ୍ ଉପଯୋଗ କରିପାରିନଥିଲେ । ପ୍ରକୃତ ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଡିଏଫ୍ ଓ ମାନେ ସଂପୃକ୍ତ ଡିଆର୍କ୍ଟିଏ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିନଥିଲେ । ଡିଏଫ୍ ଏବଂ ଡିଆର୍କ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ନ ପାରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ।

2.1.5.3 ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନହେବା କାରଣରୁ ଅସଫଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ

କଳାଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମାନୁଆଲ, 1977 ର ନିୟମ 35 ଅଧୀନରେ ଥିବା "ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସମୟ ସାଗଣା"ରେ ଚର୍ଚ୍ଚାଯାଇଛି ଯେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହିତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସାମାନ୍ୟ ଅଟେ । ଯଦି ସଂପୃକ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ପୁରା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସଫଳତା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ହେବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ । ତେଣୁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସଂପର୍କରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏକ ସବିଶେଷ ସମୟ ସାଗଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଜଠୋର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନିୟମ 30 ଅନୁଯାୟୀ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥଳର ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଉପଚାର ଯନ୍ତ୍ରର ସହ ଯୋଜନା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ପୁନଶ୍ଚ, ନିୟମ 130 (b) ଅନୁଯାୟୀ, ନିୟମିତ ମୌସୁମୀ ଦର୍ପଣ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରି କୁଳାଇ ସୁଦ୍ଧା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଶେଷ ହେବ । ବୃକ୍ଷରୋପଣ କେବଳ ଏମ୍ପ୍ଲିଏନ୍ ଆର୍କାଇଭ୍ ଏସ୍ ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଏମ୍ପ୍ଲିଏନ୍ ଆର୍କାଇଭ୍ ଏସ୍¹¹ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରି କରାଯାଇଥିଲା । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅନୁଯାୟୀ, ବୃକ୍ଷରୋପଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏମ୍ପ୍ଲିଏନ୍ ଆର୍କାଇଭ୍ ଏସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଦ୍ୱାରା ବହନ କରାଯିବ ।

ସେହିଭଳି, ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରଣାଳୀ ସଂହିତା (ସିଏମ୍ପିସି), 1990 ର ନିୟମ 2.98 ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ସ୍ଥାନରେ 60 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭୂ ବଞ୍ଚିଥିବା ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ଫସଲ ପାଇଁ ସଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । 40 ରୁ 60 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ଆଂଶିକ ସଫଳ ଏବଂ 40 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ବଞ୍ଚିବା ବିଫଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ।

ବିଭାଗର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 2013-17 ମଧ୍ୟରେ 14,315 ଆର୍କାଇଭ୍ ଏମ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବ୍ୟତୀତ ଏମ୍ପ୍ଲିଏନ୍ ଆର୍କାଇଭ୍ ଏସ୍ ଅଧୀନରେ 1,24,151 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 2,013 ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ପ୍ରଥମ 2013 ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟରୁ 11,296 ହେକ୍ଟର ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 485 ବି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ 1,035 ଆର୍କାଇଭ୍ ଏମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 18.43 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇ ଥିଲା । 2017-18 ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସମସ୍ୟା ସୂଚନା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା କିମ୍ବା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅତିବୃତ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରୁ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାବନା ବୃକ୍ଷ ବାଞ୍ଛିବା ଏବଂ ହେତନ, ମୃତ୍ତିକା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଖର, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାର ଏବଂ ଜାଚନାଶକ, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବିହନ ପଥ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଯାତ୍ର ପଥ, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପାଇଁର ଅଭାବ ହେତୁ ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରୁ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହିପରି, ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ଯାହା ପରିଶିଷ୍ଟ -3 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

¹¹ ଉତ୍ତ: ପିସିସିଏଫ୍(ଓ) ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା, 8781 ଡି-03.5.2016

ସେହିଭଳି, ବୟନ କରାଯାଇଥିବା ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ବିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପାଞ୍ଚଟି ବିଭାଜନ¹²ରେ 925 ହେକ୍ଟରରେ 35ଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ 160 ଆଇକେଏମ୍‌ରେ 2.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଫଳ ଥିଲା କାରଣ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକର ବଞ୍ଚିବାର ହାର 40 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଥିଲା । 10ଟି¹³ ବିଭାଜନରେ 4,585 ହେକ୍ଟରରେ 146 ଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ 207 ଆଇକେଏମ୍‌ରେ 9.13 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଂଶିକ ବିଫଳ ଥିଲା କାରଣ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକର ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ା 40 ରୁ 60 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ା କମ୍ ଥିଲା । ଏହିପରି, ସର୍ବମୋଟ 11.91 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ, ଏହି ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଜନାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଏହିପରି ବୃକ୍ଷରୋପଣର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ, କ୍ଷେତ୍ର ଅତିର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଭିଏସ୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକର କେପିଭି କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ସାରଣୀ 2.7 ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.7: ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥଳରେ ମିଳିତ ବାସ୍ତବିକ ଯାଞ୍ଚର ଫଳାଫଳ

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଜନ	କ୍ଷେତ୍ର	ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବର୍ଷ	ପ୍ରକାର	କ୍ଷେତ୍ର	ପଢ଼ିବା ଅନୁଯାୟୀ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରତିଶତ	କେପିଭି ଅନୁଯାୟୀ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରତିଶତ
1.	ବାମରା (ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ)	ବାମରା (ବନ୍ୟତର ଅନୁଷ୍ଠାନ)	2013-14	ଏକପ୍ରକାର	50 ହେକ୍ଟର	ପତ୍ରପତ୍ର ବିପତ୍ତ କୋପକନଥିବା	50
2.	ମାଲକାନଗିରି	ମାଲକାନଗିରି (ବେଲୁଗୁଡ଼ା)	2013-14	ଏକପ୍ରକାର	50 ହେକ୍ଟର	ପତ୍ରପତ୍ର ବିପତ୍ତ କୋପକନଥିବା	32

ବାମରା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଜନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ କେବଳ ଶାଗୁଆନ ଉଦ୍ଭିଦ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରି ଯଥା-ଗମ୍ଭୀରା, ଜାମୁନ, ଆକାସିଆ ଇତ୍ୟାଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା 3 ରୁ 18 ଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ମାଲକାନଗିରି ବିଭାଜନରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶାଗୁଆନ, କାକୁ ଏବଂ ଚାକୁଣ୍ଡା ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ତିନି ରୁ ଆଠ ଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ମୂର୍ଚ୍ଛିକାର ଗୁଣାବରା ଆକଳନ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକ ମୂର୍ଚ୍ଛିକା ପରୀକ୍ଷା କରିନଥିଲେ । ମୂର୍ଚ୍ଛିକାର ଆତୁରା ସଂରକ୍ଷଣ (ଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି) ପଦକ୍ଷେପ କୌଣସି ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇନଥିଲା ।

ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଭିଏସ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଜନାରୁ ପାଣ୍ଠି ଆବଶ୍ୟକ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଠାରୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ତେଣୁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପରେ ଅନାବନା ବୃକ୍ଷ ବାଢ଼ିବା, ସିଲଭିକଲଚର, ଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅସମାନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହାତାତାଣି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

ଅତିର୍ତ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସାକାର କରି ସରକାର ପ୍ରକାଶ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପାଣ୍ଠି ଆବଶ୍ୟକ ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଠାରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ା କମ୍ ରହିଥିଲା ।

2.1.5.4 ସ୍ଥାନ ଚୟନରେ ଅନିୟମିତତା ହେତୁ ଅସଫଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ

ଅନୁର୍ଦ୍ଧର, ଅନାବୃତ୍ତ ଜମି, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜମି, ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଲାଟେରାଇଟ୍ ବିଖଣ୍ଡ¹⁴ ଏବଂ ଜାନସିର ଘନତା କିମ୍ବା ମୂଳ ଝର 10 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃତ୍ରିମ ପୁନରୁତ୍ପାଦନ(ଏଆର) କରାଯାଇଥାଏ ।

¹² ବାମରା (18), କେନ୍ଦୁଝର (ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ) (01), କେନ୍ଦୁଝର (02), ବାମରା (ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ) (03), କୌଡ଼ (11)
¹³ ବାମରା (18), ରାଜନକେଳା (48), ବାସଗଡ଼ା (37), ମାଲକାନଗିରି (7), କେନ୍ଦୁଝର (ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ) (03), କେନ୍ଦୁଝର (7), କଳାହାଣ୍ଡି (ତଞ୍ଚିଣ) (02), ବାମରା (ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ) (8), କୌଡ଼ (10) ଏବଂ କୋରାପୁଟ (6)
¹⁴ ମୂର୍ଚ୍ଛିକା ସହ ଯାଗା ମୁହା ଅନୁରୋଧରେ ଭଲପୁର ଏବଂ ଚିଢ଼ିକୁ ପ୍ରକାରର ପଥରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ

- ଭାରତରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବିଭାଜନ ଅଧିକରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱା ରେଞ୍ଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଯାଞ୍ଚକୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 2013-16 ମଧ୍ୟରେ 710 ହେକ୍ଟର ଏବଂ 10 ଆର୍କିଭିଏନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ନଅଟି¹⁵ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିକରେ କରାଯାଇଥିଲା । କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିବରଣୀ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପତ୍ରିକାରେ ଅତିରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଅଗଷ୍ଟ 2019) ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନଥିଲା । ଅତିରୁକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 1.11 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମାତ୍ରା ରୋଲ୍ ଅନୁରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

(ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସଂଖ୍ୟା.1)

ଉପରୋକ୍ତ ନଅଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟରୁ, ଉତ୍ତର ତିରୋହେଡ଼ା ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଏଏନ୍‌ଆର୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥଳକୁ ଡେପିଭି ପାଇଁ ବନ୍ଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ପତ୍ରିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଶାଗୁଆନ, କରଞ୍ଜ, ନିମ, ଆକାସିଆ, ସିମାରୁବା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଜାତିର ବୃକ୍ଷ ଲଗାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ା ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଛମ ପୋଷ୍ଟ¹⁶, ସାଇଲ୍ ବୋର୍ଡ଼, ଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି ପରି ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇନଥିଲା ।



ଉତ୍ତର ତିରୋହେଡ଼ା ଠାରେ ଥିବା ଏଏନ୍‌ଆର୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥଳ

ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ଶାଗୁଆନ, ନିମ ଏବଂ ଆକାସିଆ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ଦୁଇରୁ ଛଅ ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ା ମାତ୍ର 15 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ଯାହା ଏହା ଏକ ବିଫଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବୋଲି ସୂଚିତ କରିଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଅତିରୁକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନ୍ୟ ଆଠଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ା ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା । ଏହିପରି, ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଫଳ ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଠଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ସଫଳ ଥିଲା ଯାହାର ସଫଳତା ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ-4 ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି । ତେଣୁ, ଏହି ନଅଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ମୋଟ 1.11 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ ଥିଲା ।

(ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସଂଖ୍ୟା.2)

- ସେହିଭଳି, କେନ୍ଦୁଝର ବିଭାଜନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପତ୍ରିକାର ଯାଞ୍ଚକୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 2015-16 ରେ ତେଲକୋଇ ରେଞ୍ଜର ଚାଲାପଡ଼ା ଖୋସାରା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ 14.98 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ 50 ହେକ୍ଟର ବୁଲ୍ (ଏଆର୍) ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ (1600 ବାବା ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର) କରାଯାଇଥିଲା । ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥଳର ଡେପିଭି ସମୟରେ,



ଚାଲାପଡ଼ା ଠାରେ ଚୋରା ବନରେ ଥିବା ଏଆର୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥଳ

ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି 50 ପ୍ରତିଶତ କାନପି ସାହୁଡ଼ା ଥିବା ଘଷ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଶାଳ ସେଠାରେ ମୂଖ୍ୟ ପ୍ରଜାତି ଥିଲା । ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏହାର ବରୁଣ ବର୍ଷରେ ଥିଲା । ପତ୍ରିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା କାମ୍ବୁ, ବାଉଁଶ, ଆମ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଛୋଟ ପ୍ରଜାତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ପ୍ରଜାତିର ହାରାହାରି ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ା 10 ରୁ 20 ଫୁଲ୍ ଉଚ୍ଚତା ସହିତ 35 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଏହିପରି, ସିଏମ୍‌ପିପି, 1990 ର ନିୟମ 2.98 ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଏକ ବିଫଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଥିଲା ।

¹⁵ ଏଆର୍-1, ଏଏନ୍‌ଆର୍-7 ଏବଂ ଆଭେନୁ-1

ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ଏଆର୍ ନୀତି ବିଚାରରେ ସ୍ଥାନ ବଦଳ ଅନୁପସ୍ଥୁତ ଥିଲା କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟି 10 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଜାମିତି ଥିବା ଅନୁର୍ଦ୍ଧିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ।

ଅତିରିକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସାକାର କରି ସରକାର ପ୍ରକାଶ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅସଙ୍ଗତିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଗଲା ଏବଂ ତାହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦିରୋଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

2.1.6 ଷଡ଼ିପୁରଜ ବନାବରଣ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧିନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ

ରାଜ୍ୟ ସିଏସ୍‌ପିଏ 2009 ଉପରେ ଏମ୍‌ଓଏସ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 9 (i) ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ଷଡ଼ିପୁରଜ ବନାବରଣ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରାଧିକରଣ (ସିଏସ୍‌ପିଏ) ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ, ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ (ଏଫ୍‌ସି) ଅଧିନିୟମ, 1980 ଅନୁଯାୟୀ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଅଣଜଙ୍ଗଲ ବ୍ୟବହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଷଡ଼ିପୁରଜ ବନାବରଣ (ସିଏ) ରୁ ପ୍ରୋହାସନ ଦେବା । ଏହା ଆଡ଼ହକ୍ ସିଏସ୍‌ପିଏରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଠିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଷଡ଼ିପୁରଜ ବନାବରଣ, ସହାୟକ ପ୍ରାକୃତିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଜଙ୍ଗଲର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସଂଗୃହିତ ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବ ।

ପୁନଶ୍ଚ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (ବୃତ୍ତାନ୍ତ) ଅନୁମୋଦନରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ଭି ରହିଛି ଯେ ବିଦ୍ଧିତ ଅଣ-ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କିମ୍ବା ଅବନତି ହୋଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ, ରାଜ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିକାସ ପ୍ରଦାନ ତାରିଖ ଠାରୁ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ କରାଯିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସଂସ୍ଥା (ସୁଏ) ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସିଏସ୍‌ପିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠିରୁ ଅନୁମୋଦିତ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ ।

2.1.6.1 ଷଡ଼ିପୁରଜ ବନାବରଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଧିନରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପନାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ

ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସିଏର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ନଥିବାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ 2013-18 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ସିଏର ସାଧାରଣ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ ଲଗ୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହାସଲ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ଯାହା ସାରଣୀ 2.8 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.8: ଷଡ଼ିପୁରଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଧିନରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ

ସିଏର ବର୍ଗ	ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ (ହେକ୍ଟରରେ)	ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ(ହେକ୍ଟରରେ)	କମ୍ପି (ହେକ୍ଟରରେ)
ସାଧାରଣ	10,403.116	7,106.220	3,296.896
ବ୍ୟାକ୍ ଲଗ୍	11,525.316	10,825.678	699.638 ¹⁶
ମୋଟ	21,928.432	17,931.898	3,996.534

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ ସାଧାରଣ (31.69 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ ଲଗ୍ (6.07 ପ୍ରତିଶତ) ସିଏ, ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଯଥାରୂପେ ଚିନି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସହ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ହେତୁ, ଅବକ୍ଷୟ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଏବଂ ଅଣ-ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ସିଏର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ହେତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ଜମି ବଚଳରେ ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇଥିବା ଜମିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରି ନଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଏଫ୍‌ସି ଅଧିନିୟମ ଏବଂ ସିଏସ୍‌ପିଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଏକ ଗଲୁଫ୍‌ଟନ ଥିଲା ।

¹⁶ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ (ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ) - 259.178 ହେକ୍ଟର 2015-16 ଉର୍ଦ୍ଧ , କେନ୍ଦ୍ରୀୟ - 3 ହେକ୍ଟର 2015-16 ଉର୍ଦ୍ଧ , କରକ (ସହର) -377.244 ହେକ୍ଟର 2017-18 ଉର୍ଦ୍ଧ , ଗୁମୁସୁର (ବଣିକ) - 11.966 ହେକ୍ଟର 2017-18 ଉର୍ଦ୍ଧ , କଳାକଣ୍ଠ(ବଣିକ) - 48.25 ହେକ୍ଟର 2017-18 ଉର୍ଦ୍ଧ

ଅତିରିକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସରକାର ପ୍ରକାଶ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ କିଛି ମାମଲା ବ୍ୟତୀତ ସିଏ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାସଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସିଏ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଆଯାଉଛି ।

2.1.6.2 ସିଏଏମ୍ପିଏ ଅଧିନରେ ହୋଇଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣର ମିଳିତ ବାସ୍ତବିକ ଯାଞ୍ଚ

ସିଏଏମ୍ପିଏ, 1990 ର ନିୟମ 2.98 ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା କମିଶେ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଫସଲ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ 60 ପ୍ରତିଶତ ତଥା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବଞ୍ଚିଲେ ସଫଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ସେହିଭଳି, 40 ରୁ 60 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଲେ ଆଂଶିକ ସଫଳ ଏବଂ 40 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ବଞ୍ଚିଲେ ବିଫଳ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ସୁନସ, ଉପରୋକ୍ତ ସଂହିତାର ନିୟମ 2.97 ଅନୁଯାୟୀ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ, ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ଅତ୍ୟୁତ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅତିରିକ୍ତ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ମୋଟ 1,187 ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟରୁ ସିଏଏମ୍ପିଏ ଅଧିନରେ 491 ଟି ପତ୍ରିକା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ 820 ହେକ୍ଟରରେ ତିନିଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ 1.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇ ଆଂଶିକ ବିଫଳ ଥିଲା କାରଣ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକର ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରତିଶତ 40 ରୁ 60 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ 488 ବୃକ୍ଷ ରୋପଣରେ ବଞ୍ଚିବା ଶତକଡ଼ା 60 ରୁ ଅଧିକ ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ଜିନ୍ତୁ, ବିଭାଜନର ଉପରୋକ୍ତ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସିଏଏମ୍ପିଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ତିନୋଟି ଜେପିଭି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ସାରଣୀ 2.9 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.9: ତିନୋଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନର ମିଳିତ ବାସ୍ତବିକ ଯାଞ୍ଚର ଫଳାଫଳ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନର ନାମ	ପତ୍ରିକା ଅନୁଯାୟୀ ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ା (ଶତକଡ଼ାରେ)	ଜେପିଭି ଅନୁଯାୟୀ ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ା (ଶତକଡ଼ାରେ)
1	ରାଜପୁର 1 (ନିୟମିତ)	85	38
2	ରାଜପୁର 2 (ଅତିରିକ୍ତ)	85	21
3	ସାଗରପାଲି	55	29

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ ଜେପିଭି ଅନୁଯାୟୀ, ଉପରୋକ୍ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ା 21 ରୁ 38 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲାବେଳେ ଡିଏଫ୍ଓ ମାନେ ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ାକୁ 55 ରୁ 85 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ।

ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ଯେଉଁଠାରେ ଉଚ୍ଚ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ବିଭାଗ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ।

ଜେପିଭିରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା ଏବଂ ଫଳାଫଳ ସର୍ବଦା ସଠିକ୍ ନଥିଲା । ତେଣୁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣର ସଠିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଅତିରିକ୍ତ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯଥା ସାବିତ୍ରୀଲାଇଟ୍ ପ୍ରତିଛବି ଏବଂ ସ୍ପ୍ଲିଏଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା, ଯାହାର ବିବରଣୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଲେଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

2.1.6.3 ସ୍ପ୍ଲିଏଲ୍/ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷରୋପଣର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ

ପ୍ରତ୍ୟେକ 20 ବର୍ଗ ମିଟର ଥିବା 5-6 କ୍ୱାଡ୍ରାଟ୍ ଜମିର ଅତିରିକ୍ତ ଜେପିଭି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲା । ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଏହି ଜେପିଭି ଦ୍ୱାରା ହିସାବ କରାଯାଇଥିବା ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ା 100 ପ୍ରତିଶତ ସଠିକ୍ ନଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଘାଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ଜେପିଭି ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରି ନଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳର ଆକାରକୁ ବିଚାର କଲେ ଜେପିଭି ଦଳ ସମଗ୍ର ସ୍ଥଳକୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିପାରି ନଥିଲେ । ତେଣୁ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରି ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ସଠିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ, ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯଥା ଉପଗ୍ରହ ଚିତ୍ର ଏବଂ ସ୍ପ୍ଲିଏଲ୍/ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ।

ସାବେଲାଇଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ୍ ଆର୍ଥ (ଜିଏ) ସଫ୍ଟୱେର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଜିଏରେ ସାଇଟର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କୋର୍ଡିନେଟ୍, ପୁର୍ବ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାଇଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଏରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସୂଚନାସୂଚୀ ଚିତ୍ର ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇଟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ/ ସବୁଜ ବନସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନହେଲା, ତେବେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱୀକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟାଣୁ ଏବଂ କ୍ଲିଅର୍ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଉପରେ ସାବେଲାଇଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବହାର କରି ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା । ଏହିସବୁ କାରଣ ହେତୁ, ମାଇକ୍ରୋ ଅରର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା । ତେଣୁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣର ବିସ୍ତୃତ ସଠିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସଂଖ୍ୟା.3

ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସଂଖ୍ୟା.4



ଉପଗ୍ରହ ଚିତ୍ର ଚାରିଖ – 14/11/2015

ଉପଗ୍ରହ ଚିତ୍ର ଚାରିଖ – 15/11/2018

ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ, ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଯଥା ଗଣନା, ବୃକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ଚିହ୍ନଟ, ବୃକ୍ଷର ଉଚ୍ଚତା, ବ୍ୟବଧାନ, ମୃତ୍ତିକାର ଆର୍ଦ୍ରତା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଇତ୍ୟାଦିର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଚିନୋଟି ଏବଂ ଆଉଁସ୍ ପୁଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାଲ୍ଟୋଭ୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥଳରେ 265 ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ଜମିରେ ସ୍ୱୀକୃତି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ବୃକ୍ଷରୋପଣ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପତ୍ରିକାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ବିବରଣୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପାୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ତ୍ୱୋନ୍ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଚାରୋଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥଳ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ସାରଣୀ 2.10 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ।

ସାରଣୀ 2.10: ବୃକ୍ଷରୋପଣର ମାନବ ବିହୀନ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଫଳାଫଳ

କ୍ର.ସଂ.	ବୃକ୍ଷରୋପଣର ନାମ	ସମୁଦାୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କ୍ଷେତ୍ର (ହେକ୍ଟରରେ)	ତ୍ୱୋନ୍ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କ୍ଷେତ୍ର (ହେକ୍ଟରରେ)	ପ୍ରକଳ୍ପ	କାର୍ଯ୍ୟକାଳିନୀ ବର୍ଷ	ବ୍ୟୟ (ଟଙ୍କାରେ)
1	ରାଜପୁର-1 (ନିୟମିତ)	50	50	ସିଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏ	2015-16	10,49,825
2	ରାଜପୁର 2(ଅନିୟମିତ)	50	50	ସିଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏ	2015-16	10,49,825
3	ସାଗରପାଲି	100	100	ସିଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏ	2015-16	23,37,800
4	ସାନବୁଡ଼ି	65	65	ଆଇସିଜେଡ୍‌ଏମ୍‌ସି	2014-15	23,98,500
ମୋଟ		265	265			68,35,950

ବୃକ୍ଷରୋପଣର ସ୍ଥଳ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ଳେଷଣା ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି:

- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଜନ ଅଧିନରେ ଥିବା ରାଜପୁର 1 ଏବଂ 2 (ନିୟମିତ ଏବଂ ଅନିୟମିତ)ର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୁଗୁଲ ଆର୍ଥି ସର୍ଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଏହାର ମାନଚିତ୍ର ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି:

ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସଂଖ୍ୟା 5



ରାଜପୁର - 1 (ନିୟମିତ) ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନ: ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାରିର ସଂଖ୍ୟା/ ପ୍ରକାର ସାରଣୀ 2.11 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.11: ରାଜପୁର-1 ରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ମାନବ ବିହୀନ ଯାନଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ

ପ୍ରକାର ବିଭାଜନ	କ୍ଷେତ୍ର/ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନ	ପୋଷାକ/ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ବର୍ଷ ସହାୟତା କ୍ଷେତ୍ର	ବୃକ୍ଷର ପ୍ରକାର	ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରତି ଥିବା ଅନୁପାତ 2015-16 ମଧ୍ୟରେ ଉପାଦାନ ଥିବା ବୃକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା	ପୋଷାକ 2021ରେ ପ୍ରକାରଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନ ଅନୁପାତ ଅନୁସାରେ ବୃକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା	ବର୍ଷିକ ପ୍ରତିଶତ	ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ (ଟଙ୍କାରେ)
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	ରାଜପୁର-1 ରାଜପୁର (ନିୟମିତ)	୫-୧୪୯୯୧୪ / 2015-16/ 50	ଶାଗୁଆନ୍	4,000	1,835		10,49,825
			କନ୍ଦୁ	2,000	0		
			ଶିଳ୍ପ	1,000	0		
			ଫାଟାନ୍	1,000	2		
			ମିମ	2,000	0		
ମୋଟ				10,000	1,837	18.37	10,49,825

ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରକାଶ ଅନୁଯାୟୀ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରିର 10,000 ଉଦ୍ଭିଦ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ 1,837 ଉଦ୍ଭିଦ ବଞ୍ଚି ଥିଲା । ତେଣୁ, ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରତିଶତ 18.37 ଥିଲା ଯାହା ଏକ ବିପଜ୍ଜୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିବ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଶାଗୁଆନ୍ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ଚାଟିରୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ ବଞ୍ଚିଥିବା 1,835 ଶାଗୁଆନ୍ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ 1,329 ଶାଗୁଆନ୍ ବୃକ୍ଷ (73 ପ୍ରତିଶତ), ବୃକ୍ଷରୋପଣର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ।


ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସଂଖ୍ୟା.6



ଭାଦପୁରର ଦୁଷ୍ଟରୋପଣ ସ୍ଥଳ - 1 (ନିର୍ମୂଳିତ)

ଗ୍ରାଫ୍ ସଂଖ୍ୟା.4

Teak Tree Height - Rajpur 1

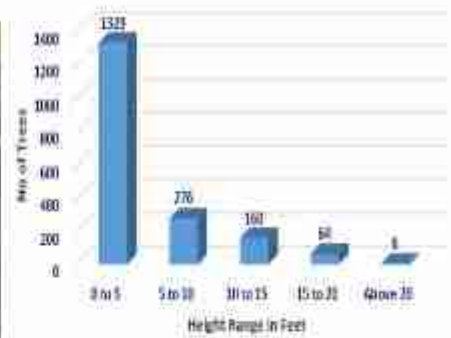

ରାଜପୁର - 2 (ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମୂଳିତ) ଦୁଷ୍ଟରୋପଣ ସ୍ଥଳ: ଯୁବକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଜାତିଗତ ସଂଖ୍ୟା/ ପ୍ରଜାତ ସାରଣୀ 2.12 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.12: ରାଜପୁର-2 ରେ ଦୁଷ୍ଟରୋପଣର ମାନବ ବିହୀନ ବିମାନ ଯାନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଫଳାଫଳ

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଭାଗର ନାମ	କେନ୍ଦ୍ର/ ଦୁଷ୍ଟରୋପଣ ସ୍ଥଳ	ପ୍ରକଳ୍ପ/ ଦୁଷ୍ଟରୋପଣ ନାମ/ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷେତ୍ର	ଦୁଷ୍ଟର ପ୍ରକାର	ଦୁଷ୍ଟରୋପଣ ପଡ଼ିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଖ୍ୟା	ମୁଖ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଖ୍ୟା	ମୋଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିହୀନ ଉପକରଣ	ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ (ଟଙ୍କାରେ)
ସୁଦେଶ	ଭଦ୍ରକ/ ଭଦ୍ରକ (ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମୂଳିତ)	ପିଏମ୍‌ସି-2015-16/ 50	କାଞ୍ଚିଆ	4,000	341	3.9	10,49,825
			କରକ	500	0		
			କିଟ୍	1,000	3		
			କାଞ୍ଚିଆ	1,500	0		
			ପିଏମ୍‌ସି	1,000	36		
			କରକ	1,000	0		
			କାଞ୍ଚିଆ	500	8		
			ନିମ	500	2		
			ମୋଟ	10,000	390		

ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟରୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରତିଶତ ମାତ୍ର 3.9 ଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ବର୍ଣ୍ଣିତ 341 ଟି ମଧ୍ୟରୁ 311 ଟି ଉଚ୍ଚତା କେବଳ ଏକରୁ ତିନି ଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ସେହିଭଳି, ବର୍ଣ୍ଣିତ 36 ଟି ସମାପ୍ତ ଦୁଷ୍ଟର ଉଚ୍ଚତା କେବଳ ତିନି ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ।


ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସଂଖ୍ୟା.7



ଭାଦପୁରର ଦୁଷ୍ଟରୋପଣ ସ୍ଥଳ - 2 (ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମୂଳିତ)


ଚାର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା.5

Sisuraha Tree Height - Rajpur 7

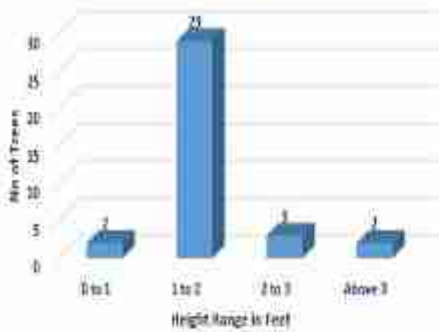

ଚାର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା.6

Teak Tree Height - Rajpur 2

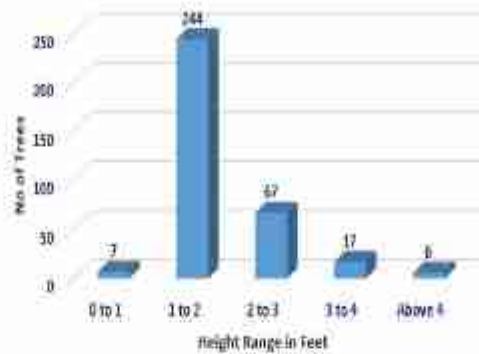

ଉପରୋକ୍ତ ଚାର୍ଟ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ଏହା ଜଣାଗଲା ଯେ ରାଜପୁର-1 ଏବଂ 2 ଠାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଚ୍ଚତା 0.5 ରୁ 20 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଥିଲା ।


• ବୃକ୍ଷ ଜାଳପି ପରିସର ଗଣନା

ଜାଳପି ପରିସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଗଛର ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଜାଗଣ ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ କ୍ରାଉନ୍ ଆକାର, ଆକୃତି ଏବଂ ଜଳତା ଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଜାଳପି ପରିସର ମାପ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯଦି କୌଣସି ଗଛ ପୁଷ୍କର ଶାଖା, ଜଳ ପ୍ରବେଶ, ରୋଗ, କୀଟ ଏବଂ ତାପ ହାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ଜାଳପି ପରିସରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ । ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ, ଅବନତି, ପତଳା କିମ୍ବା ବନାଲକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଙ୍ଗଲର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ, ବୃକ୍ଷର ବ୍ୟାସ ହିସାବ ପାଇଁ ଏକ ବୃକ୍ଷର ଜାଳପି ପରିସର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୃକ୍ଷର ବ୍ୟାସ ବଦଳ ଉପର ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।




ଚାର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 7

Tree Canopy - Rajpur 1

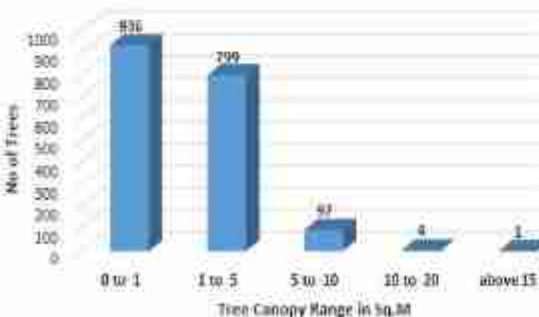

ଚାର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 8

Tree Canopy - Rajpur 2

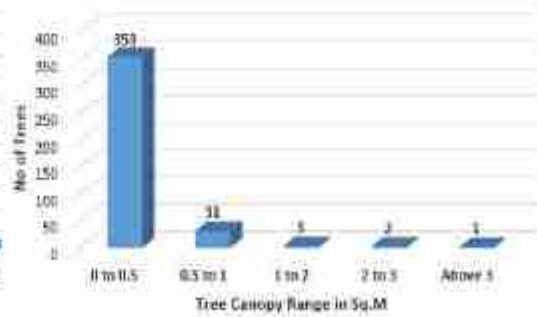

ଉପରୋକ୍ତ ଚାର୍ଟ ଚାର୍ଟରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ରାଜପୁର-1 (ନିୟମିତ) ସାଇଟରେ, 1,735 ବୃକ୍ଷର ଜାଳପି ପରିସର ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଗ ମିଟର ଏବଂ 102 ବୃକ୍ଷର ଜାଳପି ପରିସର ପାଞ୍ଚରୁ 15 ବର୍ଗ ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ସେହିପରି, ରାଜପୁର-2(ଅତିରିକ୍ତ)ରେ, 384 ବୃକ୍ଷରେ ଜାଳପି ପରିସର 0.5 ରୁ 1 ବର୍ଗ ମିଟର ମଧ୍ୟରେ

ରହିଥିଲା ଏବଂ ଛଅଟି ବୃକ୍ଷରେ କାନପି ପରିସର ଏକରୁ ଚିନି ବର୍ଗ ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା । ଏହା ସୂଚାଇଲା ଯେ, ଯଦିଓ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷିଣ, ବୃକ୍ଷବାନ ଗୁଣାବରା ସନ୍ତୋଷକନକ ନଥିଲା ।

• ମୂର୍ତ୍ତିକା ଆର୍ତ୍ତତା ସଂରକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପ-ଜଳ ଟ୍ରେସ

ଏପ୍ରିଲ 1977 ର ନିୟମ 123 (b) ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲୋପଟି ଖାଲୁଆ ହୋଇଥାଏ, ମୂଳରେ 45 ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 45 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ଧ ଖାତରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାତ 7 ମିଟର ଲମ୍ବ ହେବ ଏବଂ ବାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନଥିବା 3 ମିଟର ଲମ୍ବ ଦ୍ୱାରା ଭଙ୍ଗ କରାଯିବ । ତେନେଇ ନେଟ୍ୱାର୍କ ଜିମା ଖାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମିତ ଜଳବନ୍ଧ/ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଖାତ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିହ୍ନୁ ଏବଂ ବୈଧ କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତେନେଇ ନେଟ୍ୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଯୁବକ ବ୍ୟବହାର କରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜପୁର-1 ଏବଂ ରାଜପୁର-2 ବୃକ୍ଷରୋପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାକ୍ରମେ 215 ଏବଂ 703 ଖାତ ଟ୍ରେସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭଣ୍ଡାପଡ଼ିଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, 70 ଏବଂ 211 ଟି ଟ୍ରେସ ସ୍ୱାଭାବିକ ସହ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଥିଲା । ଏହା ଟ୍ରେସ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଥା ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଗଚ୍ଛିତ କରି ଲଗାଯାଇଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷିଣରେ ଉନ୍ନତ ଆଣିବାକୁ ବିଫଳ କରିଥିଲା । ବୃକ୍ଷରୋପଣ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଏକ ଖାତ ଟ୍ରେସର ନମୁନା ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସଂଖ୍ୟା.9 – ବୃକ୍ଷରୋପଣ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଅକାବଙ୍କା ଖାତ



ସାରଣୀ 2.13: ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନରେ ତେନେଇ ସହ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ନଥିବା ଟ୍ରେସ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	କ୍ଷେତ୍ର	ମୋଟ ଖାତ ସଂଖ୍ୟା	ତେନେଇ ସହ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ନଥିବା	ବୃକ୍ଷରୋପଣ କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ
1	ରାଜପୁର (ନିୟମିତ)	215	70	55
2	ରାଜପୁର (ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ)	703	211	55

ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତିବ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ରାଜପୁର (ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ) ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ତେନେଇ ବିଦେମ୍ଭର 2018 ପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇପାରେ ଯେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅବଧି (ଅକ୍ଟୋବର 2015 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2019)ରେ ଟ୍ରେସ ଖୋଳି ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଆର୍ତ୍ତତା ସଂରକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପ ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଗୁଗୁଲ୍ ଆର୍ଥିକ ବୈଚ୍ଛିତ୍ରିକ ବିକ୍ର ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଏହା ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି:

ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସଂଖ୍ୟା.10
ଭାରତୀୟ 2 ରେ ନକା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି (ଡିସେମ୍ବର, 2018)



ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସଂଖ୍ୟା.11
ଭାରତୀୟ 2 ରେ ଥିବା ନକା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି (ମଇ, 2020)



- ଦଳାଙ୍ଗର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଜନ ଅଧିନରେ ଥିବା ସାଗରପାଲି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥଳର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନଚିତ୍ର ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସଂଖ୍ୟା.12



ସାଗରପାଲି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନ- ଯୁବତୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶିତ ସଂଖ୍ୟା/ ପ୍ରକାର ସାରଣୀ 2.14 ରେ ଦିଆଯାଇ ଦର୍ଶନା କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.14: ସାଗରପାଲିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ମାନବ ବିହୀନ ବିମାନ ପାଇଁ ପୂରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫଳାଫଳ

ବିଭାଜନ ମାନ	କ୍ଷେତ୍ର/ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରହଣ	ଯୋଗ୍ୟ/ ନଷ୍ଟ/ ପ୍ରକାରର ଅଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟତା	ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର	ପ୍ରକାର/କ୍ଷେତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାରେ ବୃକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା	ଯୁବତୀ ଅନୁସାରେ ବୃକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା	ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପ୍ରତିଶତ	ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ର (ବର୍ଗହେକ୍ଟର)
କୋଟା	କୋଟା/ ସାଗରପାଲି	ସଂଖ୍ୟା 2015-16/ 100	ଶିମିଡ	2,000	0		23,37,800
			କାମୁଡ	9,300	1,196		
			କାମୁଡ	1,500	0		
			କାମୁଡ	1,200	0		
			କାମୁଡ	2,000	3		
			କାମୁଡ	2,000	19		
			କାମୁଡ	1,000	0		
			କାମୁଡ	1,000	0		
ମୋଟ				20,000	1,218	6.09	23,37,800

ନିମ୍ନଲିଖିତ ରଥ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା:


ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପଦ୍ଧତି ଆନୁଯାୟୀ ଆଠ ପ୍ରକାରର 20,000 ବୃକ୍ଷ ଲଗାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭିକ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ 1,218 ବୃକ୍ଷ ଜୀବିତ ଥିଲେ । ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟି 6.09 ପ୍ରତିଶତ ବଞ୍ଚିବାଗ ହାର ସହିତ ଏକ ବିଫଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ।



ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସାଇଟ କ୍ଷେତ୍ର (ଗର୍ଭୂତଳ ପଲିଗନ) ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ଥିବା ଅବଶ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଅତିବ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତ ରୋପିତ କ୍ଷେତ୍ର (ସବୁଜ ବିନ୍ଦୁ) ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲା । ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା-ଯଥ ଚାଷ (ନୀଳ ରେଖା)ରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ର (ଲାଇ ପଲିଗନ) ଭିତରେ ଥିବା ଅବଶ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଯାହା ପ୍ରବେଶ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଯାକ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା । ତେଣୁ, ବିହୀତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ସଠିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବନ୍ ଆଉ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା ।

ତାଙ୍କି ସଂଖ୍ୟା.9


Teak Tree Height - Sagarpalli

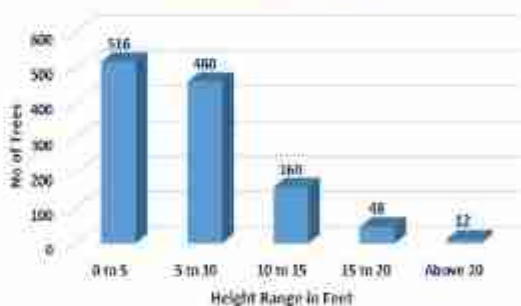

ତାର ଚାଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ, 1,218 ଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ 976 ଟି (80 ପ୍ରତିଶତ) ବୃକ୍ଷ ରୋପଣର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଟେକ ଥିଲା । ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଷଣାବେଶଟି ନହେବା, ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ସି ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସିଲଭିକଲଚର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବା ହେତୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଉଚ୍ଚତା ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ।

ତାଙ୍କି ସଂଖ୍ୟା.10

Tree Canopy - Sagarpalli

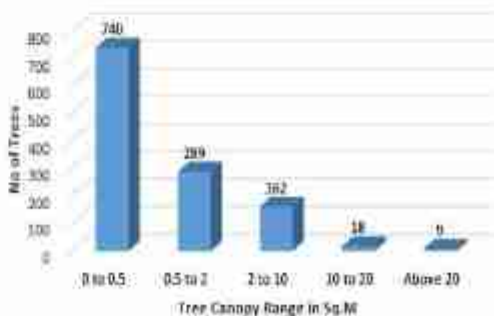

ତାର ଚାଟିରୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ, ସାଗରପାଳାରେ 1,029 ବୃକ୍ଷର କାନପି ପରିସର ଶୂନ୍ୟରୁ ଦୁଇ ବର୍ଗ ମିଟର ଏବଂ 162 ଟି ବୃକ୍ଷର କାନପି ପରିସର ଦୁଇରୁ ଦଶ ବର୍ଗ ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା । ସେହିଭଳି 27 ଟି ବୃକ୍ଷର କାନପି ପରିସର 10 ରୁ 20 ବର୍ଗ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଥିଲା । ଏହା ସୂଚାଇଲା ଯେ ଯଦିଓ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ବଞ୍ଚିବାର ଗୁଣବତ୍ତା ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥିଲା ।

• ମୂର୍ତ୍ତିକା ଆର୍ତ୍ତତା ସଂରକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପ-ଜଳ ଚେଷ୍ଟ

ସୁଏଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥଳର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଲେବଲ 121 ଟି ଷ୍ଟାଗର୍ଡ଼ ଚେଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 34 ଟି ଚେଷ୍ଟ ସ୍ୱୋପ୍ ସହ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଥିଲା ଏବଂ ତୁଳସି ଚେଷ୍ଟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରେ ଥିଲା । ଏହା ଚେଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଥା ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଗଢ଼ିତ କରି ଲଗାଯାଇଥିବା ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ବଞ୍ଚିବାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ବିଫଳ କରିଥିଲା । ତେଣୁ, 200 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ କରାଯାଇଥିବା ଟିନୋଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଫଳ ଥିଲା ଏବଂ 44.37 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାଗ ନିଷ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଭାଜନରେ ଏଏନଆର୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ 2015-16 ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ହାରାହାରି ବୃକ୍ଷପାତ ତୁଳନାରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ ବୃକ୍ଷପାତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ, ପୁରୀ, ସ୍ୱାତ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

2.1.7 ଜାତୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ମିଶନ

ଭାରତରେ ବାର୍ତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଅନେକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନୀତି ଗୁଡ଼ିକରେ ବାର୍ତ୍ତା ବୃକ୍ଷ ରୋପଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ବାର୍ତ୍ତା ଭିତ୍ତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ଗଢ଼ିତ ପ୍ରୟତ୍ନ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗର ବିକାଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଗରିବ ଦୁର୍ଗଳ ବର୍ଗ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, କୃଷକ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (ଏସ୍‌ସି) ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ଏସ୍‌ଟି) ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ, ଜାଗିକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ, ଭାରତ ସରକାର (ଜିଓଆଇ) 2006-07 ରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ସହିତ ଜାତୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ମିଶନ (ଏନ୍‌ବିଏମ୍) ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । 2014-15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସହାୟକ ଅନୁଦାନ (ଜିଆଇଏ) ଭାବରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଚୁର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2015-16 ଠାରୁ ଅର୍ଥ ପଞ୍ଜିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟରୁ 60:40 ଅଂଶ ଆଧାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ।

2.1.7.1 ଜାତୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ମିଶନ ଅଧିନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ

ସିଏମ୍‌ପିସି, 1990 ର ନିୟମ 2.98 ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ସ୍ଥାନରେ ବାର୍ତ୍ତାମିଆଦି ଫସଲ ପାଇଁ 60 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବଞ୍ଚିଥିବା ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବୋଲି ଲୁହାଯାଇପାରେ । ସେହିଭଳି, 40 ରୁ 60 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ଆଂଶିକ ସଫଳ ଏବଂ 40 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ବଞ୍ଚିବା ବିଫଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବୋଲି ଲୁହାଯାଇପାରେ । ପୁନଶ୍ଚ, ଉପରୋକ୍ତ ସଂହିତାର ନିୟମ 2.97 ଅନୁଯାୟୀ, ଟିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅବଧିର ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ମୋଟ 1,187 ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟରୁ 41 ଟି ପତ୍ରିକା ଏନ୍‌ବିଏମ୍ ଅଧିନରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ 40 ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ଜମିରେ 8.38 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାଗ ବ୍ୟୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଟିନୋଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଫଳ ଥିଲା କାରଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରତିଶତ 40 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିଭଳି, 116 ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ଜମିରେ 26.37 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାଗ ବ୍ୟୟରେ କରାଯାଇଥିବା 10 ଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଂଶିକ ବିଫଳ ଥିଲା କାରଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରତିଶତ 40 ରୁ 60 ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ 28 ଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରତିଶତ 60 ରୁ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ତାହା ସଫଳ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକର ଉପରୋକ୍ତ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ 38 ଟି ବାର୍ତ୍ତା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟିରେ କେପିଡି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ସାରଣୀ 2.15 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ।

ସାରଣୀ 2.15: ବାର୍ଦ୍ଧିଶ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ମିଳିତ ବାସ୍ତବିକ ଯାଞ୍ଚର ଫଳାଫଳ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରକର ନାମ	ପଢ଼ିବା ଅନୁଯାୟୀ ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ା (ଶତକଡ଼ା)	କେପିଭି ଅନୁଯାୟୀ ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ା (ଶତକଡ଼ା)
1	ବେରତାମାରି	55	52
2	ବନମହୁରତୀ	82	35
3	କଳାପାଟ ଆରୁଏପ୍	90	94
4	କେଶିଡ଼ିଆ	ପଢ଼ିବାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନଥିଲା	65
5	ସପରଟିଗୁଡ଼ା	ପଢ଼ିବାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନଥିଲା	12

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ (କେପିଭି ଅନୁଯାୟୀ) ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଶତ 12 ରୁ 94 ଥିଲାବେଳେ ବିନୋଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଡିଏଫ୍‌ଓମାନେ ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ାକୁ 55 ରୁ 90 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଏହି ବିନୋଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ବିନୋଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ଡିଏଫ୍‌ଓମାନେ ପଢ଼ିବାରେ ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ା ଉଲ୍ଲେଖ କରିନଥିଲେ ।

2.1.7.2 ବାର୍ଦ୍ଧିଶ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ

ବୌଦ୍ଧ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଜନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଛଅଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରକର ମିଳିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରାୟୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଦ୍ଧିଶ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଅତିର୍ ବଳ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଜନର କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2021 ମଧ୍ୟରେ ନମୁନା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ମାନଚିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା.1



• **ସାଇଟ୍ ଚୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଉପକରଣ**

13 ଟି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟରୁ ବିନୋଟି ଯଥା ବୌଦ୍ଧ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ କୋରାପୁଟ ବିଭାଜନକୁ ନମୁନା ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟର କୃଷି-ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି ମୁଖ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ଏହି ବିନୋଟି ବିଭାଜନକୁ କୃଷି-ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତି ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । କୃଷିଗୁଡ଼ିକର ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ା, କୃଷି ପ୍ରତି ବିକଶିତ କଲ୍ଚର ସଂଖ୍ୟା, କୃଷିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କଲ୍ଚର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ବ୍ୟାପ ଉପରେ ସିଙ୍ଗାଟ ଗୁଡ଼ିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ମୃତ୍ତିକା ପଦାର୍ଥ ରାସାୟନିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଉପର ଜାନସି ଉଦ୍ଭିଦଗାଳି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବୃକ୍ଷପାତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ସାଇଟ୍ ସ୍ଥିତି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ମୃତ୍ତିକାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରୁ 0-30 ସେ.ମି ଗଭୀରତାରୁ ମାଟିର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଓୟୁଏଚିର ମୃତ୍ତିକା ବିଜ୍ଞାନ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ।

• ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଫଳାଫଳ

ବାଉଁଶ ବିକ୍ଷେପଣ ପ୍ରଥମ ଡିନି ବର୍ଷରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସଂବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଗୋଟାଗୋଟି ଯୋଗ୍ୟ । ପ୍ରଥମ ଡିନି ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁମ୍ଭି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କରେ । ଡିନୋଟି କଲ୍‌ଲ ବିଭାଜନରେ ବାଉଁଶ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ସାରଣୀ 2.16 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.16: ବାଉଁଶ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ମିଳିତ ବାସ୍ତବିକ ଯାଞ୍ଚର ଫଳାଫଳ

କ୍ର. ସଂ.	ଉପକ୍ରମ ବିଭାଗର ନାମ	ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରାନ୍ତର ନାମ	ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବର୍ଷ	ପ୍ରକାଶ/ ଉପକ୍ରମର ଅଞ୍ଚଳ	ପ୍ରକାଶିତ ନାମ	ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଂଖ୍ୟା (ବ୍ୟକ୍ତିଗତ)	କେମିଟି ପ୍ରତ୍ୟାଘାତ ବର୍ଷର ଉତ୍ତର
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା (କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା)	2014-15	ଫୁଲ୍‌ବ୍ଲୋକ୍ / 25	କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପକ୍ରମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍‌ସ୍ୱ	3,60,234	52 (ଅଂଶିତ ଉପକ୍ରମ)
2		ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ)	2015-16	ଫୁଲ୍‌ବ୍ଲୋକ୍ / 10	କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପକ୍ରମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍‌ସ୍ୱ	1,33,180	58 (ଅଂଶିତ ଉପକ୍ରମ)
3	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା (କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା)	2013-14	ଫୁଲ୍‌ବ୍ଲୋକ୍ / 20	କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପକ୍ରମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍‌ସ୍ୱ	4,60,754	35 (କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା)
4		କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା (କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା)	2016-17	ଫୁଲ୍‌ବ୍ଲୋକ୍ / 60	କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପକ୍ରମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍‌ସ୍ୱ	13,10,100	94 (କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା)
5	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା (କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା)	2013-14	ଫୁଲ୍‌ବ୍ଲୋକ୍ / 20	କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପକ୍ରମ	4,07,260	65 (କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା)
6		କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା (କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା)	2014-15	ଫୁଲ୍‌ବ୍ଲୋକ୍ / 25	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍‌ସ୍ୱ	5,13,926	12 (କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା)

ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକାର	ଉପକ୍ରମର ବୃଦ୍ଧିପାତ୍ର	କେମିଟି ପ୍ରତିପାତ୍ର ଉତ୍ତର	କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପକ୍ରମ/ ଫୁଲ୍‌ବ୍ଲୋକ୍	ପ୍ରାଥମିକ ବୃଦ୍ଧିର ଉତ୍ତର (ମି)	ପ୍ରାଥମିକ ବୃଦ୍ଧିର ଉତ୍ତରର ବ୍ୟାପକତା (କେମି)	ବିକ୍ଷେପଣ ବିଭାଗ
9	10	11	12	13	14	15
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବିଭାଗର ଉତ୍ତର	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା	40 ରୁ 50	6.6	6.6	2.1	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପକ୍ରମର ଉତ୍ତର
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା	50 ରୁ 60	5.9	5.5	1.9	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପକ୍ରମର ଉତ୍ତର
ମଧ୍ୟମ ଉପକ୍ରମର ଉତ୍ତର	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା	45 ରୁ 55	3.9	4.0	1.8	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପକ୍ରମର ଉତ୍ତର
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା	0 ରୁ 40	6.6	7.8	3.1	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପକ୍ରମ	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା	0 ରୁ 10	8.4	8.6	3.9	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା	0 ରୁ 5	2	0.3	0.5	କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଭାଗ

ଫଳାଫଳର ବ୍ୟାପକତା 15

ଫଳାଫଳର ବ୍ୟାପକତା 16



ଫଳାଫଳର ଉତ୍ତର ଉପକ୍ରମର ଉତ୍ତର ଉପକ୍ରମର ଉତ୍ତର

- ଏହା ବେଶାଗଲା ଯେ ଛଅଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଂଶିକ ସଫଳ ଥିଲା, ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳ ଥିଲା । ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ା ସାପରାଞ୍ଜିଗୁଡ଼ା (ଲମାଟାପୁଟ ବେଞ୍ଜ, କୋରାପୁଟ ବିଭାଜନ) ରେ 12 ପ୍ରତିଶତରୁ ପଞ୍ଚା- ବାଟାଶାମନରେ (ଟେଲକୋଇ ବେଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ବିଭାଜନ) 94 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ।
- ସ୍ଥାନର ଗୁଣବତ୍ତା, ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକାରି ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାରେ ବିଭିନ୍ନତା ଥିଲା । ଛୁଲ ସାଇଟ୍ ବ୍ୟୟନ ଏବଂ ଖରାପ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ସାପରାଞ୍ଜିଗୁଡ଼ା ଠାରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ପାଟନା ବେଞ୍ଜର ବନାମାହୁଲଟିଆ ଠାରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ବଞ୍ଚିବାର ହାର 35 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ଯାହା ଖରାପ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା ।
- ଛଅଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ 40 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଜାନସି ପରିସର ଥିବା ବିବ୍ୟୟନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସର୍ବୋତ୍ତମ ନଥିଲା ।
- ବଞ୍ଚିବ ଅବଧିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପତ୍ରିକା ଅନୁରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହା ସୂଚାଇଲା ଯେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀମାନେ ପରାମର୍ଶିତ ସମୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲେ ଏବଂ ସମୟ ପୂର୍ତ୍ତରୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ।
- ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏହା ଅନୁଭବ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଗ୍ରାଜ ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିଲା, ଯଦିଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ରାଜ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ।

ରେଣୁ, ଡାକୋଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଫଳ ଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବାଞ୍ଚିଣ ପ୍ରକାରିରୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟୟନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ପ୍ରଚୁର ଜୈବ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ବୟସା ବାମୋସ୍ ଭଳି ପ୍ରକାରିରୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ବିଆଯିବା ଉଚିତ୍ । ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 16.68 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଷ୍ଠଳ ଥିଲା । ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ବଞ୍ଚିଣା ସ୍ଥିତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରନ୍ୟତ୍ର ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚର ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ।

2.1.8 ବଞ୍ଚିତ ସବୁଜ ବଳୟ/ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ

ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ, ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା (ଏସ୍ପି) ଅଧିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଯଥା-ଏଆର୍, ଏଏନ୍‌ଆର୍, ଆଭେନ୍ୟୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଦୁର୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ସହରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ବାଞ୍ଚିଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାହାଡ଼ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲା । ବନାଜରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଥିବା 11 ଟି ଯୋଜନା¹⁷ରୁ ମିଳିତ କରି 2013-14 ରେ ବର୍ଷିତ ସବୁଜ ବଳୟ (ଆଇଜିସି) ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।

2.1.8.1 ବାଞ୍ଚିଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଦୌ ନଥିବା

ଓଏପ୍‌ଡି ସଂହିତା, 1979 ର ନିୟମ 28(i) ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଅଫିସର(ଆରଓ) କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରକୃତି, ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପରିମାଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଗାଘା, କୋଠା, କୃତ୍ରି ଇତ୍ୟାଦିର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଜନା ଜାଣି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପୁନଶ୍ଚ, ଏସ୍ପିଏମ୍, 1977 ର ନିୟମ 26 ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ପ୍ରକାରି ଯାହା ଗୋଟାଗଣ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଜିଙ୍ଗ୍ ହୋଇପାରିବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାଉଜିଙ୍ଗ୍

¹⁷ ସହରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଔଷଧୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଆର୍ଥିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଓଡ଼ିଶା ବାଞ୍ଚିଣ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଆଭେନ୍ୟୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, କାଲେଣା ଦକ୍ଷ ଦୁଇହା ଲୋକାଭାଗୁଡ଼ା, ଡେଇଁ-କଲମ, ସ୍ତ୍ରୀୟା ନର୍ସିଂ, ସାମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା ଏବଂ ପରିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂରକ୍ଷଣ

ବିଲୋପ ହୋଇନପାରିବ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆନଯିବ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୋପଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ।

➤ କୋରାପୁଟ ବିଭାଜନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନଥି (ପତ୍ରିକା) ଯାଞ୍ଚକୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 2013-14ରେ ଲମଗାପୁଟ ରେଞ୍ଜରେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଜନା ନକସା 5.51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 566.65 ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ବାଗିଚାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ (ପିଆରଏଫ୍)ରେ ଏକ 40 ହେକ୍ଟର ବାଉଁଶ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଅତିରୁ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚର୍ଯ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା :

- ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କିଛି ଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା ଯେପରିକି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିବରଣୀ, ସାଇଟ୍ ଅବସ୍ଥାନ ବିବରଣୀ, ଜଳବାୟୁ ଚର୍ଯ୍ୟ, ପୂର୍ବ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ବିବରଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇ ନଥିଲା । 5.51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇନଥିଲା ଯେହେତୁ କେବଳ 4.18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ପତ୍ରିକାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା ।

- ଏହାର ଅସ୍ଥିତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧିକ ବୃକ୍ଷର ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ା ଆନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଜନର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ କେପିଭି କରାଯାଇଥିଲା । ଯେହେତୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସାଇଟ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପୋଜିସନିଙ୍ଗ୍ ସାଫ୍ଟୱେ (ଜିପିଏସ୍) ସଂଯୋଜନା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପତ୍ରିକାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନଥିଲା, ପିଆରଏଫ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଇଟର ଅବସ୍ଥିତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ବିଭାଜନର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତିରୁକୁ ଗୋଟିଏ ବି ଲଗାଯାଇଥିବା ବାଉଁଶ ଚିହ୍ନଟ କରାଇପାରିନଥିଲେ । ତେଣୁ, 5.51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଫଳ ଥିଲା । ଏଥିସହ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ଅପବ୍ୟବହାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ ।

ସରକାର ବ୍ୟତୀତ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ନିମ୍ନ ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରତିଶତ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

➤ କେନ୍ଦୁଝର (ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ) ବିଭାଜନର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନଥି ଯାଞ୍ଚ କରି ଅତିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ହତବଳ ଅଭ୍ୟାସରେ 10 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଏକ ବାଉଁଶ ବୃକ୍ଷରୋପଣ 2.02 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ



କରାଯାଇଥିଲା । ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 0.68 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । କେପିଭି ଦଳ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ କୌଣସି ସାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ୍ ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭ ପୋଷ୍ଟ୍ ନଥିଲା । ଯଦିଓ

ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନ ଯତ୍ନିକାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ମତେ ଜିପିଏସ୍ ସଂଯୋଜନା ସହିତ ମେଳ ଖାଇଥିଲା, କେପିଭି ଚଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବାଉଁଶ ବୃକ୍ଷ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରି ନଥିଲା । ବାଉଁଶ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଚୟନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଥିଲା କାରଣ ଏକ ଘଷ୍ଟି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା 2.02 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ନିମ୍ନ ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରତିଶତ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

2.1.9 ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ବୃକ୍ଷରୋପଣ

ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ଜଙ୍ଗଲ¹⁸ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦାନକାରୀ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଯାହା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପରିଚେଷ୍ଟ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଯୋଗାଇଥାଏ । ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛ, ଜଳଡ଼ା, ବିଲୁଡ଼ି ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବିହୀନ ନରମ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ବାସ କରନ୍ତି । ଏହି ମହ୍ୟ ଧରିବା ସ୍ଥାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ଉପକୂଳ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉତ୍ସ । ଏହି ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକ କୋରାଲ ରିଫ୍ ମାଛ ସମେତ ଅନେକ ମାଛ ପ୍ରଜାତି ପାଇଁ ନିର୍ଭର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ଉପକୂଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର କ୍ଷୟକୁ ସମୁଦ୍ରଲତ୍ତୁ ଏବଂ ଝଡ଼ ଠାରୁ ରୋକିଥାଏ । ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଏକାକୃତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଦତ୍ତ (ଆଇସିକେଟ୍-ଏମ୍ପି), ଯିଏ ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭିତରକନିକାରେ ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା (ଏମ୍-ଏପି)



ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସଂଖ୍ୟା.18 – ଭିତରକନିକାରେ ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ବୃକ୍ଷରୋପଣ

କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

2.1.9.1 ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ

ରାଜନଗର ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଜନ ଅଧିନରେ ଥିବା ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥଳର କେପିଭି ସମୟରେ, ଗଭୀର କାଦୁଅ ଅକ୍ଷଳ ଏବଂ ପ୍ରକଳ ଜଳବନ୍ଧିତା ହେତୁ କେପିଭି ଚଳ ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରି ନଥିଲେ । ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଥିଲା ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ପଦ୍ଧତି । ସାନଟୁରିରେ ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପ୍ରତିଛବି ଏବଂ ଯୁଏଭି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି :

¹⁸ ଉତ୍ସ:- ଉତ୍କଳବୃକ୍ଷମ୍ ସମାଜ ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ପୁସ୍ତକସମାପ

ରାଜନଗର ମାଲ୍ଟୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଜନ ଅଧିନରେ ଥିବା ସାନଗୁଡ଼ି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନଚିତ୍ର ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ।

ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସଂଖ୍ୟା 19



ମହାବୀରପଡ଼ା ରଙ୍ଗର ରେଞ୍ଜ ଅଧିନସ୍ଥ ସାନଗୁଡ଼ିଠାରେ ଥିବା ମାଲ୍ଟୋଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ

ସୁଏଲି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସ୍ତରର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ସାରଣୀ 2.17 ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.17: ସୁଏଲି ଦ୍ୱାରା ମାଲ୍ଟୋଇ ବୃକ୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଫଳାଫଳ

ଉତ୍ପାଦନ ବିଭାଜନ ନାମ	କ୍ଷେତ୍ର/ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନ	କ୍ଷେତ୍ର/ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବର୍ଷ/ କ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ	କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକାର	ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପାତ ବୃକ୍ଷ	ସୁଏଲି ଅନୁପାତ ବୃକ୍ଷ	ମୋଟ କର୍ମ (ବେଫାରେ)	ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ଯୋଗଦାନ ଟ୍ୟାକ୍ସ (ବେଫାରେ)
ଭାରତର	ମହାବୀରପଡ଼ା/ ସାନଗୁଡ଼ା	ପଦ୍ମକଳେର ଉପପ୍ର./ 2014-15/ 65	ଝିଲୁଙ୍ଗ ଏବଂ ରାମ	288925	105333	23,98,500	36.46
ମୋଟ				288925	105333	2398500	36.46

ବୃକ୍ଷର ବଞ୍ଚିବା ଶତକଡ଼ା ସାନଗୁଡ଼ିରେ 36.46 ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏକ ବିଫଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ।

2.1.9.2 ସାଗର ଶାଖା ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ ନିହେତୁ

ସାଗର ଶାଖା ହେଉଛି ମାଲ୍ଟୋଇ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବନ ରେଖା । ସେମାନେ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧୁର ଏବଂ ଜୁଆର ଜଳ ବହନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣି । ସତେଜ ପକ ମାଟିକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରି ପ୍ରଚାଳନ ମଧ୍ୟ କରେ । ଉଚ୍ଚ, ନଦୀର ଗଡ଼ିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କୈଟିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ଜଳ ଚ୍ୟାନେଲର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଅନେକ କାରଣ ହେତୁ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ । ସମୟ ସମୟରେ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଶାଖାଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣରେ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗଠନର ଉତ୍ପାଦନର ଉତ୍ପାଦନକୁ ଅନୁରୋଧ । ନବୀକରଣ ଏକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷିଆ ଚକ୍ରରେ କରାଯିବାର ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ମାଲ୍ଟୋଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କୌଶଳ ଭିନ୍ନ ଅଟେ । ମାଲ୍ଟୋଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଅଛି ଯଥା-ବିହନ ଏବଂ ହାଲପୋକୋଟାଇଲ । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଜଳମଗ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମାଛ ଅସ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଳିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଉଁଠାରେ ମାଲ୍ଟୋଇ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଭାବରେ ଆସିଥିବ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ମାଛ ଅସ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଡିଏଫ୍‌ଏକ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହେବାର ଥିଲା । ଏହିପରି, ପରିଚାଳନା ହସ୍ତକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସାଗର ଶାଖା ନବୀକରଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲବଣତା ଉତ୍ପାଦନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଗର ଶାଖା ଏବଂ ଦୈନିକ ସହ ବିଦ୍ୟମାନ ଚ୍ୟାନେଲ ସଂଖ୍ୟା ସମନ୍ୱୟ ସୂଚନା, ଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବର୍ଷ, 2013-18 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଶାଖା ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ

ବର୍ଷାୟ ଯୋଜନା ଦସ୍ତାବିଜ ଅତିବ୍ରତ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଗର ଶାଖା, କୁଆର ବ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ମାଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟାନେଲରେ ନବୀକରଣର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଭାଜନ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

ଚେଣ୍ଟା, ଏଥିରୁ କ୍ଷମ୍ପା ଲକ୍ଷ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସାଗର ଶାଖା ଏବଂ ବ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟାନୁସାରେ ନବୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯଦିଓ ଭିତରକନିକା ମାଲ୍ଟୋଇଡ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଏମ୍‌ଏସି) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହାର ଭିତରରେ ସରକାର ଡର୍ଣ୍ଣାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ 2013-18 ମଧ୍ୟରେ 72.56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏମ୍‌ଏସି ଅଧିନରେ 70.94 ହେକ୍ଟର ବ୍ୟାନେଲ ଶୋଳା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏପିଓ ଅଧିନରେ 16.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 21 କିଲୋମିଟର ସାଗର ଶାଖା ଏବଂ ବ୍ୟାନେଲ ନବୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ସାଗର ଶାଖା ଏବଂ ବ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦସ୍ତାବିଜ ଅତିବ୍ରତ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

2.1.10 ମିଳିତ ବାସ୍ତବିକ ପରିଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ

କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅତିବ୍ରତ୍ତ ସମୟରେ, ଅତିବ୍ରତ୍ତ ଦଳ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ କେପିଭି ଦଳ 34 ଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷର ବଞ୍ଚିବା ଆକଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ବିଭାଜନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଜନାରୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାଗୁଆନ୍ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଆମଲା, ବାଉଁଶ, ନିମ୍ବ, ବାଲୁଆ ଏବଂ କାଜୁ ପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରିର ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ଥିତି ଜରାପ ଥିଲା । ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ, 35 ଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟରୁ 985 ହେକ୍ଟର ପରିମିତ 18 ଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ଥିଲା, 305 ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ଛଅଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଂଶିକ ସଫଳ ଥିଲା ଏବଂ 11 ଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସଫଳ ଥିଲା । 24 ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ (ବିଫଳ ଏବଂ ଆଂଶିକ ସଫଳ ଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି) ଏସିପି ଅଧିନରେ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନ, ସିଏଏମ୍‌ପିଏ ଅଧିନରେ ଆଠଟି ସ୍ଥାନ, ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର(ଇଜିଏସ୍) ଅଧିନରେ ନଅଟି ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏନ୍‌ଡିଏମ୍ ଏବଂ ଏନ୍‌ଏସି ଅଧିନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣର ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ା କେପିଭି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଶୁନରୁ 53 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଏଫ୍‌ଓଏ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 10 ରୁ 95 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ଚେଣ୍ଟା ଏହି 24 ଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ 2.51 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ନିଷ୍ଠଳ ଥିଲା ଯାହାକି ପରିଶିଷ୍ଟ -5 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଷନା କରାଯାଇଅଛି ।

ଉପରୋକ୍ତ ଅତିବ୍ରତ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ।

ସୁପାରିଶ (ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ)

- ବିଭାଗ, ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିକୁ ରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ପ୍ରଜାତିର ଚୟନ ମୂଲିକା, ବୃକ୍ଷପାତ, ଚାପମାତ୍ରା, ହେନେଜ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାରାମିଟର ଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ହେବା ଉଚିତ୍ ।
- ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର(ଇଜିଏସ୍) ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆନୁମୋଦନ ଏବଂ ସଫଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଉପଯୋଗ ସହିତ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭାଗ ସଭାସ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଡିଏଫ୍‌ଓମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ସଭାସ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଆରଡିଏଙ୍କ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ ।
- ଯେକୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭାଗ ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ଯଥା 10 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଜାମି ପି ସାହିତ୍ୟ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ ଇତ୍ୟାଦି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରନ୍ତି ।
- ବୃକ୍ଷରୋପଣର ପ୍ରଭାବ ତଥା ତକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ବିଭାଗ, ନିର୍ମୋର୍ ସେନ୍ଟ୍ରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯଥା ସାଟେଲାଇଟ୍ ପ୍ରତିଛବି ଏବଂ ସ୍ପ୍ରିଏଣ୍ଡ / ହେନ୍, ପରି ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ।

ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା

2.1.11 ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା

2.1.11.1 ତଦାରଖର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ପରିହାସ୍ୟ ବ୍ୟୟ

ବର୍ଷ 2016 ର ମୂଲ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଗ୍ୟାପ୍ ମତ୍ୟୁକ୍ତ¹⁹ ବିନା ସହାୟକ ପ୍ରାକୃତିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମତ୍ୟୁକ୍ତରେ ପ୍ରକୃତ ଚାରା ରୋପଣ ବିନା କେବଳ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ । ଏହି ମୂଲ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଶୁନରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ବିମାଲେସନ, ସାଇଟ୍, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସିଲଭିକଲଚରାଲ୍ ଅପରେସନ, ମୂଲିକା ସଂରକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପ, ଫାୟାର ଲାଇନ୍ ଟ୍ରେସିଂ, ତଦାରଖ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ । ଓଏଫ୍ଡି ସଂହିତା, 1979 ର ନିୟମ 29 ଏବଂ 30 ଅନୁଯାୟୀ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ବିଆଯାଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେହିଭଳି ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଡ଼ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଧିକରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ମତେ ଅନାବନା ଗଛ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଫରେଷ୍ଟରାଟ୍ ଦାୟା ରହିବେ । ପୁନଶ୍ଚ, ଏଫ୍ଡିଏମ୍, 1977 ର ନିୟମ 179 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ 25 ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ନୂତନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରେ ।

ଏହି ମୂଲ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ମତ୍ୟୁକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣା ଯେ ଯଦିଓ ପ୍ରକୃତରେ ବିହନ ବୁଣାଯାଇ ନଥିଲା, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାରି ବର୍ଷ ଅବଧି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ତଦାରଖ ପାଇଁ 21 ମ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍²⁰ (ଦିନକୁ 200 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 4,200 ଟଙ୍କା)ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହୋଇନଥିବା ହେତୁ ତଦାରଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପରିହାସ୍ୟ ଥିଲା କାରଣ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବାଡ଼ ପାଇଁ ଫରେଷ୍ଟର ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡମାନେ ଦାୟା ଅଟନ୍ତି । 2016-18 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 63.19 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 4,06,640 ହେକ୍ଟର²¹ ଗ୍ୟାପ୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିନା ଏବଂ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ପରିହାସ୍ୟ ଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଜୈବିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଜିଏସ୍, ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ତଦାରଖ ପାଇଁ ପୃଥକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇନଥିଲା । ମୂଲ୍ୟମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ମତ୍ୟୁକ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ସିଲଭିକଲଚରାଲ୍ ଅପରେସନ ଏବଂ ମୂଲିକାର ଆର୍ତ୍ତାତ୍ମା ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଡ଼ ଚ୍ୟାଟ, ଯାଞ୍ଚ ପଥ ଏବଂ ଫାୟାର ଲାଇନ୍ ଟ୍ରେସିଂ ପାଇଁ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୂଲ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।

2.1.11.2 ବୃକ୍ଷରୋପଣର ମୂଲ୍ୟ ମାନାଦର୍ଶରେ ଅସଙ୍ଗତି ହେତୁ ପରିହାସ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଳ୍ପ ଉଦ୍ଭିଦ ନିମା ଖାଲି ମାଟି ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କୁହିଁମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ(ଏଆର୍) ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଭିଦ ରୋପଣର ଏକମାତ୍ର ପଦ୍ଧତି । ଏହି ପଦ୍ଧତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବୁକ୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସହରା ବନାବନା ହେଉଛି ସହରା ପରିବେଶରେ ଏକକ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା । ଜନଗହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସବୁଜ ପୁଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଭାଗ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ସହରା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା । 2016-18 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 2016 ର ମୂଲ୍ୟ ମାନାଦର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ

¹⁹ ଗ୍ୟାପ୍ ମତ୍ୟୁକ୍ତ ବିନା ଏବଂ ଅଧିକ ର ଅର୍ଥ ଯେଉଁଠି କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନୀୟ ବେଶା ପ୍ରକାର ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଖେତ୍ରଟି କେବଳ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଏ । ମତ୍ୟୁକ୍ତରେ ଆଉ କୌଣସି ନୂତନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ।

²⁰ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଚାଟଟି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍, ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଚାଟଟି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍

²¹ ଭାର: ବର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିପେଟ୍ 2016-17-160,880 ହେକ୍ଟର, 2017-18-245,760 ହେକ୍ଟର

କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ଯଥୋପରି ରଖି ପ୍ରଚଳିତ ମଜୁରୀ ହାର ଯଥା 150 ରୁ 200 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୂଲ୍ୟ ମାମାଦର୍ଶି 2016 କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଉତ୍ପାଦନ କୁଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ମାମାଦର୍ଶିର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ପାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ, କୁଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ, ଗୋଟିଏ ହେକ୍ଟରରେ ଛଅ ମାସର 1600 ବିଞ୍ଚନକୁ 2.5 ମିଟର x 2.5 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ସହରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ, 0.625 ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଛଅ ମାସର 1000 ଗଛକୁ 2.5 ମିଟର x 2.5 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଚ୍ଚତର, ମୂଲିକା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚମାରଣ ପରି ସମାନ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅସଙ୍ଗତି ଥିବା ଅତିବ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା । 2016 ର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମୂଲ୍ୟ ମାମାଦର୍ଶି ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଉପାଦାନର ତୁଳନା ସାରଣୀ 2.18 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନା କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.18: କୁଳ ଏବଂ ସହରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ମୂଲ୍ୟ ମାମାଦର୍ଶିର ତୁଳନା

କାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଦାନ	ମସହର ବ୍ୟବସ୍ଥା (ଟଙ୍କାରେ)		ସହରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣର 1600 ଗଛ ପାଇଁ ଅନ୍ୟତମ ବ୍ୟୟ	1600 ଗଛ ପାଇଁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ (ଗଞ୍ଜ.4 x 200ଟଙ୍କା)	ଗଛ ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା/1600) (ଟଙ୍କାରେ)	ସହରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ 1000 ଗଛ ପାଇଁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)
	କୁଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ (1600 ଗଛ)	ସହରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ (1600 ଗଛ*)				
1 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ-ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଚ୍ଚତର, ମଝି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚମାରଣ	26	347	321	64,200	40.13	40,130
2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ-ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଚ୍ଚତର, ମଝି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚମାରଣ	28	394	366	73,200	45.75	45,750
3 ତୃତୀୟ ବର୍ଷ- ସର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଚମାରଣ	29	330	301	60,200	37.63	37,630
4 ବରୁଣି ବର୍ଷ- ଚମାରଣ	15	298	283	56,600	35.37	35,370
5 ଗମତ	98	1369	1271	2,54,200	158.88	1,58,880

ଉତ୍ସ: ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମୂଲ୍ୟ ମାମାଦର୍ଶି 2016. * ତୁଳନା ପାଇଁ ସହରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣର 1000 ଗଛର ତୁଳନାରେ 1600 ଗଛର ମୂଲ୍ୟ

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ ସହରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ମୂଲ୍ୟ ମାମାଦର୍ଶିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରମ ଉପାଦାନ, କୁଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ (14 ଗୁଣ) ଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ 1000 ଗଛ ପାଇଁ 1.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ମାମାଦର୍ଶିରେ ଗାର୍ଡିଆନ/ ଚାଡ଼ ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚମାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରମ ଉପାଦାନର ବ୍ୟୟ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଥିଲା । 2016-18 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳରେ 25.05 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଗଛ ପ୍ରତି 158.89 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 39.80 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ମାମାଦର୍ଶି, ମୂଲ୍ୟ ମାମାଦର୍ଶି ନିମିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସହରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରି ଏବଂ ଚାହୁଁ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ, କୈବିକ ଚାପରୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକରିବା ପାଇଁ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ମାମାଦର୍ଶି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କାରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସହରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ 14 ଗୁଣ ଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକତା କିପରି ଥିଲା, ବିଭାଗ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରି ନଥିଲା । ଏହା ଗୋଟିଏ ହୋଇନଥିଲା କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

2.1.11.3 ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାମାଦର୍ଶିତାରୁ ଅଧିକ ପରିହାସ୍ୟ/ ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ

ଏପ୍ରିଲ 1977 ର ନିୟମ 187 ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେ ଡିଏଫ୍‌ଓ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଭାଜନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଇଟମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟର ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚାକି ବନ ସଂରକ୍ଷକ (ସିଓଏଫ୍)କୁ ଦାଖଲ କରିବେ, ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଆକଳନଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷ ଉପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପିଛା ମୋଟ ମୂଲ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ । କିନ୍ତୁ, ଚାକି ସର୍ଜଲ ପାଇଁ ସରକାରୀକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ ଠାରୁ ଚାହା ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ ।

- ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା 12 ଟି ବିଭାଜନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ନଗର ଆକାଉଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିର ନଥି ଯଥା କରି ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ 47 ରେଖର 112 ଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରେ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟ ମାମାଦର୍ଶି ବାଣ୍ଟରେ 93.60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନିୟମିତ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ପରିଶିଷ୍ଟ -6 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତ୍ରୀୟା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଡ଼ାଯାଇ ପରିଥାନ୍ତା ।

ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ କ୍ଷେତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ମୂଲ୍ୟ ମାମାଦର୍ଶି ଅନୁଯାୟୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରମ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇଟମ୍ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅବଧି କ୍ଷୟ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟ ମାମାଦର୍ଶିରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯାହା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବା କଥା ।

- ଗୋଟିଏ ବିଭାଜନ²² ରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ନଗର ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚକୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 2014-15 ରେ 800 ହେକ୍ଟର (200 ଉତ୍ତର/ ହେକ୍ଟର) ପରିମିତ ପାନପୋଷ ରେଖର ଡିରୋବେଡ଼ା ଆରୁଏଫ୍‌ରେ ଖ୍ୟାୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହିତ ଏଏନଆର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାର ଥିଲା । ଜାନୁଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ମଧ୍ୟରେ ଗତ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତୀତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ପଥ-ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ଡିମୋଣ୍ଟିସନ୍, ସାଇଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦିରେ 10.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଉକ୍ତ ଏଏନଆର ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ 400 ହେକ୍ଟରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା 5.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ 800 ହେକ୍ଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ 400 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 16,000 ବିହନ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ 400 ହେକ୍ଟର ଉପରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଷ୍ପଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।

2.1.11.4 ସିଏଫ୍‌ସିଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଧିନରେ ସିଲଭିକଲଚରାଲ୍ ଅପରେସନ୍ ଉପରେ ଅନିୟମିତ ଖର୍ଚ୍ଚ

ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମୂଲ୍ୟ ମାମାଦର୍ଶି 2016 ଅନୁଯାୟୀ, ଏଏନଆର ବୃକ୍ଷରୋପଣ (200 ଉତ୍ତର/ ହେକ୍ଟର)ରେ ପୂର୍ବ-ରୋପଣ (ଶୁନ ଚମ ବର୍ଷ) ସିଲଭିକଲଚରାଲ୍ ଅପରେସନ୍ (ଏସ୍‌ଓ), ଜାନୁଆରୀ-ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 1,000 ଟଙ୍କା ହାରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହେକ୍ଟର ପିଛା 200 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଇ, ସାଇଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ କରାଯିବ । ଜୁଲାଇ-ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା 3,000 ଟଙ୍କା (15 ମ୍ୟାଣ୍ଡେଇ) ଚଳରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏସ୍‌ଓ କରାଯିବ । ଏହି ଏସ୍‌ଓରେ ଅନାବନା ଗଛ ସଫା କରିବା, କ୍ୱାଲମର ନାଟିବା, ଉଚ୍ଚ ଷ୍ଟି କରିବା, ସୁନ୍ଦର ସିଙ୍ଗଲିଙ୍ଗ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

²² ଡିଏଫ୍‌ଓ, ଭାରତରେ

ବିଭାଜନ ବିଭାଜନରେ ଅତିରିକ୍ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପଡ଼ିକା ଏବଂ ବ୍ୟବ୍ ବୁକ୍, ଗିଫୋର୍ଟ ଗିବର୍ଣ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଯାଜ୍ଞ କରୁଥିଲା । ଅତିରିକ୍ତରେ ଏହା ଜଣାଗଲା ଯେ 11 ରେଖରେ ସିଏଏମ୍ପିଏ ଏପିଓ 2015-16 ଅଧିନରେ 6,000 ହେକ୍ଟର ଏଏଏଆର୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ (200 ପୁଂକ୍/ ହେକ୍ଟର) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାନୁଆରୀ-ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ରୋପଣ ଏସ୍ତ କରାଯାଇନଥିଲା କାରଣ ସେପରି କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିଲା କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିକାରେ ଦର୍ଶାଯାଇନଥିଲା । ଜୁଲାଇ-ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଡିସେମ୍ବର 2016 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ମଧ୍ୟରେ ପୋଷ୍ଟ ରୋପଣ ଏସ୍ତ (ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ)ର ମୂଲ୍ୟ ହେକ୍ଟର ପିଛା 3,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା 4,000 ଟଙ୍କା ହାରରେ 2.40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଷ୍ଟ ରୋପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟ ମାନାଦର୍ଶକୁ ଉଲ୍ଲୁଂଘନ କରି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପର ରୋପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ ମୂଲ୍ୟ ମାନାଦର୍ଶରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟାନୁସାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପରେ ଏହି ଏସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାର ଥିଲା ।

2.1.11.5 ଆଭେନ୍ୟୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣର କ୍ଷତି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର(ଜିଓଓ) ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସର୍କୁଲାର (ଜୁନ 2018) ଅନୁଯାୟୀ, ଜଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ଅଣଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣରେ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଗଛ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଗୁଣ, ସିଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଲଗାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବରୁ ପରିବେଶକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ସର୍ବ ରଖାଯାଇଛି ।

ଗାରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଜନ²³ରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନଥିବୁଡ଼ିକର ଯାଜ୍ଞରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 2013-18 ମଧ୍ୟରେ 131 ଆରକ୍ଷେତ୍ରରେ 32,750 ଟାଣା ସହିତ 13 ଟି ଆଭେନ୍ୟୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ପରିଶିଷ୍ଟ-7 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ (ପିଡ଼ବୁଡ଼ି)/ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ (ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇ) ଦ୍ୱାରା 2017-18 ରେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଡିଏଫ୍ଏ ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନଥିଲା । କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପାଇଁ ଡିଏଫ୍ଏମାନେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ କିମ୍ବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଏଫ୍ଏମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ଏକେନ୍ୟୁ(ସୁଏ) (ପିଡ଼ବୁଡ଼ି/ ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇ) କୌଣସି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଯୋଜନାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇନଥିଲେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଉଲ୍ଲୁଂଘନ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ମାନାଦର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ 3.92 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ଅତିରିକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ।

2.1.11.6 ସିଏଏମ୍ପିଏ ପାଣ୍ଠିକୁ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ସିଏ ପାଣ୍ଠି ନିୟମାବଳୀ, 2018 ର ଉପନିୟମ 5 ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା 2 ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠିରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ନେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ (ଏନ୍ପିଭି) ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଉପ-ନିୟମ(2) ଏବଂ ଉପ-ନିୟମ(3) ରେ ପ୍ରବର ପଦ୍ଧତିରେ ଉପଯୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ଏନ୍ପିଭି ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ବଳେଦ୍ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ପୁନଶ୍ଚ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା (ଏକେଡ୍) ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ଲାନସିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହା 7,000 ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି (ଭିଏସ୍ଏସ୍) ଏବଂ ଇକୋ ବିକାଶ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର 30 ଟି ବେରିଟୋରାଲ୍ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଜନରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗ ବିକାଶ ସୋସାଇଟି (ଓଏପ୍ଏସ୍ଡିଏସ୍) ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ।

²³ ବିଭାଜନ, ନେଗୁଡ଼ିର ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ, ବେଦାଣ୍ଡାଲ ଏବଂ ଗାଉରକୋଳା

ଏକେଡ୍ରାଲ ନଥିଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପିସିସିଏଫ୍ (ଓ) କ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନାକୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ସିଏସ୍‌ପିଏ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ସିଏସ୍‌ପିଏ ଏପିଓ 2014-18 ରୁ 225.84²⁴ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଉପରୋକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅନ୍ୟତ୍ର ବିନିଯୋଗର କାରଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ନଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ସିଏସ୍‌ପିଏ ଅଧିନରେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଏକେଡ୍ରାଲର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ଥିବା ଅର୍ଥ କମିଟି ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ସିଏସ୍‌ପିଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ୟୁରସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକେଡ୍ରାଲରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ସିଏସ୍‌ପିଏ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଥିଲା ।

2.1.11.7 ବୃକ୍ଷରୋପଣ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଅନିୟମିତ ବ୍ୟୟ

ଜଙ୍ଗଲ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମାନ୍ୟତା, 1977 ର ନିୟମ 35 ଅନୁଯାୟୀ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଆବଦ୍ଧ । ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏକ ବିଳମ୍ବ ଆରମ୍ଭ ପାଞ୍ଚତଃ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ପିସିସିଏଫ୍ (ଓ) ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମୂଲ୍ୟ ମାନାବର୍ଣ୍ଣ 2016 ଯେ ବର୍ଣ୍ଣାଯାଇଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ବୃତ୍ତୀୟ ବର୍ଷର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଥା ମୂଲିକା କାର୍ଯ୍ୟ, ଖର, ଉଇଡ଼ିଙ୍ଗ୍, ଇତ୍ୟାଦି ସହ ସମଗ୍ର ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏଫ୍/ ଡିପାରିଖ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟରୁ ନଭେମ୍ବର ।

ଅତିରିକ୍ତ, ବର୍ଷ 2017-18 ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ନଥି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ (ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା) ଅଧିନରେ “ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗ୍ରାନ୍ତ ଲଭର (ଆଇଡିସି)” ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଆବେଦନ ଏବଂ ବିଚରଣର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହା ଜଣାଗଲା ଯେ ବର୍ଷ 2017-18 ରେ 4,300 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 2015-16 ବୃକ୍ଷରୋପଣର ବୃତ୍ତୀୟ ବର୍ଷର ଅର୍ଥନୈତିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାହାଡ଼ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ଓଡ଼ିଡିପି ଏବଂ ଆରୋନ୍ୟୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଧିନରେ 1,000 ଆରକେଏମ୍ ପାଇଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ 6.15 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବର୍ଷ 2018-19 ର ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2017-18 ରେ ସିଏସ୍‌ପିଏ ସୁଧ ପାଣ୍ଠି ଅଧିନରେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ହୋଇନଥିବାରୁ “2017-18 ର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଦାୟିତ୍ୱ” ଭାବରେ ବିଚରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଯେହେତୁ କୌଣସି ବୃକ୍ଷରୋପଣ/ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚଣ ଆଧାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ସେପରି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଡିଏଫ୍‌ଓମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ଉକ୍ତ ପାଣ୍ଠିର ଆବେଦନ ଅନିୟମିତ ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ଚଣ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ଡିଏଫ୍‌ଓ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ 2017-18 ର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଦାୟିତ୍ୱ ଆକାରରେ ବୃତ୍ତୀୟ ବର୍ଷର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 2018-19 ରେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଚଣ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେପରି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ।

2.1.11.8 ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନାବର୍ଣ୍ଣରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଇ ସହରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ଅନିୟମିତ ବ୍ୟୟ

ଆଠ ମାସର ବିହନ ସହିତ 1,000 ଚାରାକ ସହରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ (ବୁକ ମନ୍ୟୁ) ନିମନ୍ତେ ବାଡ଼ ଏବଂ ବୃତ୍ତୀୟ ବର୍ଷର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନାବର୍ଣ୍ଣ 2014 ରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ।

ନଥିଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଆଗଲା ଯେ 2014-15 ରୁ 2017-18 ମଧ୍ୟରେ ସହରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପିସିସିଏଫ୍ (ଓ) କ୍ ଦ୍ୱାରା ବାଡ଼ (କଂକ୍ରିଟ୍ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମା ତାର ଇତ୍ୟାଦି) ଏବଂ ବୃତ୍ତୀୟ

²⁴ ଏପିଓ - 2014-15 (1862 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା), 2015-16 (2241 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା), 2016-17 (11710 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଏବଂ 2017-18 (6771 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)

ବର୍ଷର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଅନିୟମିତତା ଭାବରେ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲା । ପୁସ୍ତକ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ମାନାବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଲ୍ଲୁଙ୍ଘନ କରି 13 ଟି ବିଭାଜନରେ ଥିବା 29 ଟି ସାଜଗଢ଼ରେ ବାଡ଼ି ଏବଂ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ବର୍ଷର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (ଉପରୋକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଥାକ୍ରମେ 6.32 କୋଟି ଏବଂ 8.50 କୋଟି ଟଙ୍କା) ପାଇଁ 14.82 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ-୫** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ ସହରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟ ମାନାବର୍ଣ୍ଣ, ମାନାବର୍ଣ୍ଣ 2014 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରଣ ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟର ମାନାବର୍ଣ୍ଣରେ ଏହାକୁ ଅକାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗାଦିଆନ୍ ମୂଲ୍ୟ ମାନାବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସମୟରେ ବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟରତ କରାଯାଇଥିଲା । ବାଡ଼ି ପାଇଁ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଅନୁମୋଦିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମୂଲ୍ୟ ମାନାବର୍ଣ୍ଣ 2014 ରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ।

2.1.11.9 ବ୍ୟୟ ନକରି ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଅନିୟମିତ ଦାଖଲ

ଜିଓଆଇ ଦ୍ଵାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା (ଅକ୍ଟୋବର 2013) ମଞ୍ଜୁରୀ ଆବେଦନ ଅନୁକ୍ଳେପ 2 (b) ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିଭାଗ ନିକଟରେ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ । ପୁନଶ୍ଚ, ଉପ-ଅନୁକ୍ଳେପ (h) ଧାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯେ କୌଣସି ବଳକା ରାଶି ଯାହା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅନୁମୋଦିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନପାରେ, ଉକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜିଓଆଇକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ଓଡ଼ିଶା ବାର୍ଡ଼ର ବିଭାଗ ଏଜେନ୍ଟ୍ (ଓବିଟିଏ) ରେ ଆବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ସମନ୍ଵୟ ନଥିବୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଅଡ଼ିବ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ସମସ୍ତ ସୁସ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ କରିବା ପରେ ଜିଓଆଇ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଅନୁମୋଦିତ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଏଏପି) ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ବର୍ଷରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ, 2013-18 ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ଆବଣ୍ଟନ / ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିବା 25.84 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 18.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 7.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ନହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ସମୁଦାୟ ଆବଣ୍ଟିତ ରାଶି ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର (ସୁସ୍ଥି) ଜିଓଆଇକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ବଳକା ରାଶି ସହିତ ସମୁଦାୟ ରାଶି ପାଇଁ ସୁସ୍ଥି ଦାଖଲ କରିବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଥିଲା । ଅନୁମୋଦନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପାଣ୍ଠି ଜିଓଆଇକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା । ଅଧିକତ୍ଵ, ଅକ୍ଟୋବର 2018 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି (ଏସ୍ଏଲ୍‌ଇସି) ବୈଠକରେ ଏହା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ବଳକା ରାଶି ସହିତ ସମୁଦାୟ 12.12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଳକା ରାଶି (ଆରମ୍ଭରୁ) ଓବିଟିଏ ନିକଟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଯଦିଓ ଜିଓଆଇକୁ ସମୁଦାୟ ରାଶି ପାଇଁ ସୁସ୍ଥି ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମ୍ପର୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଫଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ପାଣ୍ଠିର ଉପଯୋଗ ନହେବା ହେତୁ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ, ଓବିଟିଏର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଏଏପି) ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହି ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ପରେ, ସୁସ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଓଆଇ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଣ୍ଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଏପିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ବଳକା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇନଥିଲା ।

2.1.11.10 ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଖଚକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ନକରି ପାଣ୍ଠିର ଅନିୟମିତ ପ୍ରଦାନ

ଏନ୍‌ସିଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, 2006 ର ପାରା 6.4.5 ଅନୁଯାୟୀ, କଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଡ଼ର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 2013-14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବୁର ପିଛା 25,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଯାହା

ଦୁଇଟି ସମାନ କିଛିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଥିଲା । 2014-15 ରୁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 42,000 ଟଙ୍କାକୁ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଡିନୋଟି ବାର୍ଷିକ କିଛିରେ 50:25:25 ଅନୁପାତରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ପୁନଶ୍ଚ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମତେ ଉଚ୍ଚିତଗୁଡ଼ିକର 90 ପ୍ରତିଶତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଧାର କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ଅତିରିକ୍ତ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ଏହା ଦେଖିଲା ଯେ 13 ଟି ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟରୁ 10²⁵ ଟି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଜନ ଅଧିନରେ 73 ଟି ସ୍ଥାନରେ ମୋଟ 1,580 ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2013-17 ମଧ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଏଫ୍‌ଓ ମାନକୁ ଆବଦ୍ଧିତ ହେବାକୁ ଥିବା 5.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ କିଛିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ା ସୁନିଶ୍ଚିତ ନକରି ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିରିକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସରକାର ପ୍ରକାଶ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ କିଓଆଇ ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏବଂ ଏନଡିଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ 2013-17 ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଡିଏଫ୍‌ଓ ମାନକୁ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଭାଜନ ସ୍ତରରେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅଭାବ ହେତୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ା ବଦଳିବା ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣାୟ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଡିଏଫ୍‌ଓମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସଂସ୍ଥା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଓବିଡିଏ ପାଳନାୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଥିଲା ।

2.1.11.11 ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯାନବାହାନର ଚୟନ

କିଓଓ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011) ସର୍କ୍ୟୁଲାରର ଅନୁକ୍ଷେପ 5(b) ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ସେବା ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ପ୍ରାଧିକୃତ ଜର୍ଜୁପକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବୈଦିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାରିଟି ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରି ଅଫର ମାଗିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ସବିଶେଷତା ରଥ ପ୍ରାଧିକୃତ ଜର୍ଜୁପକ୍ଷଙ୍କ ଡ୍ରେବ୍ ସାଇଟ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ । କାର୍ଯ୍ୟ/ ସେବା ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଅତିତଃ ପକ୍ଷେ ଏକ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚାରିତ ଜାତୀୟ ଖବର କାଗଜରେ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ବିକାସ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ । ସହରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାମାତର୍ଣ୍ଣରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର / ବ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ, ଶ୍ରମ ଓ ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ରାଉରକେଲା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଜନରେ ନଗଦ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚକୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ନଭେମ୍ବର 2015 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ମଧ୍ୟରେ ଚିନିଟି ରେଞ୍ଜ ଯଥା ପାନପୋଷ, କୁଅଁରମୁଣ୍ଡା, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ସହରୀ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ନକରି ଜଳସଂରକ୍ଷଣ ବାବଦରେ 69.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାପା ମାମାତର୍ଣ୍ଣ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ପରିଶିଷ୍ଟ-9 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାମାତର୍ଣ୍ଣରେ ଜଳସଂରକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ସହରୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ଜଳସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ବୁଦ୍ଧି ଭିତ୍ତିରେ ଗାର୍ଡି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ରେଞ୍ଜ ସ୍ତରରେ ବୁଦ୍ଧିନୀମା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଗାର୍ଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବା ନେଇ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ । ଯଦିଓ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ବୁଦ୍ଧି ଭିତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା

²⁵ବିଭାଜନ, ଚୈତ, କୋଣାର୍କ (ଏସ୍), କୋରପୁଟ, କେନ୍ଦୁଝର, ମାଲକଜଗିରି, ଚେନାଖୋଳ, ଗାୟାଲ୍ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

ସୁପାରିଶ (ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା)

- କୌଣସି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିନା ପୁନରୁତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବାକୁ ଗ୍ୟାଫ୍ ବିନା ଏଏନଆର ଅଧିନ ମୂଲ୍ୟ ମାନାଚର୍ଣ୍ଣରେ ଦେବାଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନକରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭାଗ ବିଚାର କରିପାରିବ ।
- ବୁକ୍ସି ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ସମାନ ବୟାସର ଯଥା ଶ୍ରେଣିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ବିଚାର କରିପାରିବ ।
- ସିଏ ପାଣ୍ଟି ନିୟମାବଳୀ, 2018 କୁ ଭଲ୍ୟୁୟନ କରି, ବିଭାଗ ସିଏଏମ୍‌ସିଏ ପାଣ୍ଟିକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିନିଯୋଗ ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଚାର କରିପାରିବ ।
- ପାଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ ଓ ବିନିଯୋଗରେ ଏମ୍‌ଜିଏନଆରଇଜିଏସ୍, ସିଏଏମ୍‌ସିଏ, ଏକେଡ୍ରାଇ, ଏନ୍‌ଟିଏମ୍ କର୍ମଚାରୀ ଇଳି ଯୋଜନାରେ ଥିବା ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ମାନାଚର୍ଣ୍ଣକୁ ଅନୁଯାଜନ କରାଯାଇଥିବା ବିଭାଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ପାରିବ ।
- ବୃକ୍ଷରୋପଣର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ କିଛିରେ ଡିଏଫ୍‌ଓମାନଙ୍କୁ ଏନ୍‌ଟିଏମ୍ ଅଧିନରେ ଥିବା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ା ସୁନିଶ୍ଚିତ ନକରି ପାଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅନୁଚିତ୍ ।

ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ

2.1.12 ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥଳର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

2.1.12.1 ବୃକ୍ଷରୋପଣର ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନ ହେବା

ଏଫ୍‌ସିଏମ୍, 1977 ର ନିୟମ 207 ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ (ଆର୍‌ଓ) ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଥରେ ପରେ କାନ୍ଥୁଆରୀରେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଜୁନ୍ ମାସରେ ଗଠନ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲଗାତାର ଚିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିରୀକ୍ଷଣ ପରେ (କ) ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚତା, (ଖ) ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା, (ଗ) ସମୁଦାୟ ବଞ୍ଚିଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ସଂଖ୍ୟା, (ଘ) ବଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରତିଶତ, (ଙ) ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏବଂ (ଚ) ଅନାବନା ଗଛ ବୃଦ୍ଧିର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଉ ଓ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ନଭେମ୍ବର 5 ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ 5 ଜୁଲାଇରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିଏଫ୍‌ଓଙ୍କୁ ଏକ ପୃଥକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯିବ ।

ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପରିକାର ଯାଞ୍ଚକୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 1,187 ଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟରୁ 148 ଟିରେ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରେମାସିକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଡିଏଫ୍‌ଓମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ଯାହା ବୃକ୍ଷରୋପଣର ସଫଳତାକୁ ଆକଳନ କରିବାକୁ ଏକ ମାତ୍ର ପନ୍ଥା ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଭଲ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାରୀ ପରିକାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ବୃକ୍ଷରୋପଣର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଥିବା ଅଭାବକୁ ସୁଚିତ୍ କଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ ଅତିବ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଗଲା ।

2.1.12.2 ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଭାବ

ଏଏଫ୍.ପି. 1988 ର ଅନୁଲେଖ 4.14 ଅନୁଯାୟୀ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ସମକ୍ଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଭାବ ଏକ ଚିତ୍ରାତ ବିଷୟ କାରଣ ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ଆମ୍ଭତ୍ରୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ଦେଖିବା ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସୂଚନା ଅପ୍ଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ ଏବଂ ଯତ୍ନପାତ୍ର ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚାଳନାର ପ୍ରାଥମିକ ଦିଗ ଉପରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ସମୟାନୁଯାୟୀ ସଂଗ୍ରହ, ସଂକଳନ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ନଥି ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅସଙ୍ଗତି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା:

- **ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନଥି/ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନୁରକ୍ଷଣ କରାଯିବା**

ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସୂଚନାକ ସଂଖ୍ୟା, ଉପଲବ୍ଧ ଅବକ୍ଷୟ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଖାଲି ଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଜମି ସମକ୍ଷୟ ମୌଳିକ ସୂଚନା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଣଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ପିସିସିଏଫ୍ ଓଥା ଚକ୍ଷୁ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଡିଏଫ୍.ଓକ୍ ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଭୌତିକ / ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତା ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା, ପିସିସିଏଫ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜନଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନେତ୍ରୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚା/ ସୂଚନା ଅନୁରକ୍ଷଣ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୂଚନା ଅନୁରକ୍ଷଣ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳିନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏହାର ଏକକାଳିନ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହିପରି ବୈଧ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ଏଏଫ୍.ପି.ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଉଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।

- **ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସୂଚନାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସତ୍ୟତା ନଥିବା**

2013-18 ଅବଧିର ଭୌତିକ/ ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟହାସଲ ଏବଂ ମ୍ୟାନଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ବିଭାଜନୀୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସୂଚନାର ଯାଞ୍ଚକୁ କଣାଗଲା ଯେ ସୂଚନା କିମ୍ବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନୁରକ୍ଷଣରେ ସମାନତା ନଥିଲା । ବର୍ଷିତ୍ୱାତା, ପ୍ରକଳ୍ପତ୍ୱାତା ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ା ସହିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣତ୍ୱାତା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନୁରୂପ ଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନଥିବାରୁ ଉଭୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଭାଜନ ସ୍ତରରେ ସମାନ ଭାବରେ ଗଣଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସତ୍ୟତା ନଥିଲା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ବର୍ଷିତ୍ୱାତା, ରେଞ୍ଜିତ୍ୱାତା ଏବଂ ଯୋଜନାତ୍ୱାତା ଚର୍ଚ୍ଚା ବାହାର କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା ।

- **ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରେଡ୍ ଆଧାରିତ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପୋର୍ଟାଲ୍ ଇ-ଗ୍ରାନ୍ ଡ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ନଥିବା**

ସିଏଏଫ୍.ପିଏ ପାଣ୍ଡିତ କେତେ ଉପଯୋଗ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଇ-ଗ୍ରାନ୍ ଡ୍ୱାରା ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଅନୁଲୋଚନା ବିଷୟ ଲାଗୁରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବ ।

ଅତିରିକ୍ତ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ଏଏଫ୍.ପି.ଆଇ ନିକଟରେ ଜଙ୍ଗଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ନଥିବା ଯେହେତୁ 503 ସିଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 288 ସିଏ ସ୍ଥାନର (57 ପ୍ରତିଶତ) ଚର୍ଚ୍ଚା ବହୁଗୁଣ²⁶ ସହିତ ଅପ୍ଡେଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2010 ଠାରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ 2015 ସ୍ଥାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଅପ୍ଡେଟ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ।

²⁶ ବହୁଗୁଣ ହେଉଛି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ବହୁଗୁଣକାର ବେନ । ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସୁକର ପ୍ରାଚୀରର ନୋଅର୍ଡିନେଟ୍ସ ଗୁଣକୁ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପୁରୁ କରି ଏକ ବହୁଗୁଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଆଉଁସକୁ ସିଏସଏମ୍‌ସିଏ ପାଣି ପ୍ରଦାନ ବେଳେ (ଜାନୁଆରୀ 2017) ବେଶ୍‌ଲେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟୋଚନା ପାରାମିଟର ଉପରେ ଗାନ୍ଧୀ ଗିପୋର୍ଟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥିଲା । 12.79 ବହୁଭୁଜ ଭୁଲ୍ ଏବଂ 76.12 ପ୍ରତିଶତ ଅନିର୍ଦ୍ଧିତ ସହ ଇ-ଗ୍ରାନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ 11.09 ପ୍ରତିଶତ ଭୁଲ୍ ଥିଲା । ଇ-ଗ୍ରାନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ଲୋଡ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁଭୁଜ ଗୁଡ଼ିକର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଂ ଉପରେ କୌଣସି ଗିପୋର୍ଟ ନଥିଲା ।

ଅତିର, ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ।

2.1.12.3 ଆଇଜିସି ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନହେବା

ଆଇଜିସିର ପ୍ରକଳ୍ପ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ରେମ 12 ଅନୁଯାୟୀ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବୃକ୍ଷାୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବାର ଥିଲା । ରୋପଣ ହୋଇଥିବା ଚାରା ବଞ୍ଚିବା, ଚାରାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ନଥି ଅନୁରକ୍ଷଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାଭନ୍ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଚାର୍ ବିକ୍ଷି ପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଚାରା ରୋପଣର 60 ଭାଗ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସଫଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଗିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବିଚାର କରାଯିବାର ଥିଲା ।

ବୃକ୍ଷାୟ ପକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନଥି ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚକୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆଇଜିସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହେବାର ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2018 ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ବିଭାଗ, ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏମ୍‌ଓଏସ୍ ଏବଂ ସିସିଏର ଏକ ସମ୍ପର୍କାସିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫିରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ (ଆଇଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍), ଭେପାଳ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 76.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2018) । ଜିଲ୍ଲା ସମୟ ଏବଂ ଦେୟ ସୂଚୀରେ ମତ ଭେଦ ହେତୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବାତିଲ୍ ହୋଇଥିଲା (ଅପ୍ରେଲ 2018) । ଜିଲ୍ଲା ଆଇଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍, ବିନା ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ବୁଢ଼ ମାସ ସ୍ଥାନରେ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ସମୟ ଏବଂ 50 ପ୍ରତିଶତ ଅଗ୍ରାମ ଦେୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ଯାହା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପରିଶେଷରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଢ଼ିନାମା ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ରେ ସାକ୍ଷାତ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ 38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରାମ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2019), ଆଇଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା । ଏହିପରି, ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଏକକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରାୟ 48 ମାସ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ ଆଇଆଇଏଫ୍‌ଏମ୍, ପିସିସିଏସ୍ (ଓ ଏବଂ ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅର୍ଥମ ଗିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ସେହି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଗିପୋର୍ଟର କୌଣସି ନକଲ ଅତିରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା ।

2.1.12.4 କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ

ପିସିସିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିବା 13 ଟି ବିଭାଗର ସହ ଏଫ୍‌ଆର୍‌ଏସ୍ ବିଭାଗରେ ମଞ୍ଜୁରା ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟାର ସମାକ୍ଷରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ସୁଦ୍ଧା ମଞ୍ଜୁରାପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ସାମଗ୍ରୀକ ଭାବେ 16 ରୁ 38 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଥିଲା ଯାହା ପରିଶିଷ୍ଟ-10 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ।

ସରୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଥିଲା, ବୃକ୍ଷାୟ ପକ୍ଷରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟା ଥିବା ଅଣଗେଜେଟେଡ୍ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ 15 ରୁ 38 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା । ଏହି ଖାଲି ପଦବୀ 2013-18 ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାଷ୍ଟରେ ରହିଥିଲା ।

ଉଚ୍ଚତରେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ଯେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବକୁ ଆଇଜିସି ଅଧିନରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରାକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ସୁପାରିଶ (ବୃକ୍ଷରୋପଣର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ)

- ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଚୈତନୀୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଚିଏଫ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରାଯିବ ବିଭାଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ ।
- ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ବିଭାଗ ନାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ, ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଏହାର ଏକକାଳୀନ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ।
- ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଲ୍ଲବ ଭରମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ।

2.1.13 ଉପସଂହାର

➤ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଅର୍ଥୋତ୍ତମ ଅଭାବ ସହିତ ସମାପିତ ହେଲା, ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅବାସ୍ତବ ଭାବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚାଇଲା । ଅବଶ୍ୟକ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଏବଂ ଖାଲି ଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଜମି ସମନ୍ୱୟ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା କାରଣରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଣାଳୀ କେବଳ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ଭାଗ କରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତରଫରୁ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା । ଭେଞ୍ଜ, ବିଭାଗ ଏବଂ ଚଳ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ବାର୍ଷିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଯୋଜନା ସମନ୍ୱୟ ଆବଶ୍ୟକତା ତଥ୍ୟ ଯେପରିକି ଯୋଜନାଦ୍ୱାରା ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ, ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବ୍ୟୟ, ଜାରିତ ଥିବା ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଶତ ଇତ୍ୟାଦି ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷକ (ଓ ଏବଂ ଏଡ୍‌ଏଫ୍‌ଏଫ୍) ସ୍ତରରେ ଅନୁରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଭୁ-ଜନନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜାତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ, ନିଜସ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ନୀତି (ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ସି) ଗଠନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଜ ବନସ୍ତ ବୃଦ୍ଧିର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଜନା ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯୋଜନା/ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିକଳ୍ପନା ବିନା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ସହ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟୟନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

➤ ଅବନତି ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଅଣଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସମନ୍ୱୟ ତଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସିଏସ୍‌ଏଫ୍‌ସି ଅଧିନରେ କ୍ଷତିପୂରକ ବନାଜରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ସମ୍ଭବ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଯାହାଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ପରିଚର୍ଚ୍ଚନା ଦୁର୍ଗତରେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିସରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ।

➤ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା କାରଣ ବିଭାଗ ସବେଶୀ ପ୍ରକାରି ରୋପଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ନିକଟରେ ଶାଗୁଆନ୍ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାରି ଭାବରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରକାରିଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚ ଏବଂ କାନସି ପରିସର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅବଧି ସହିତ ଅନୁରୂପ ନଥିଲା । ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟା ଆର୍ତ୍ତତା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା କାରଣ ଖାଗର୍ଡ଼ ଟ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଆଗେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ନିର୍ବାହ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭୁଖଣ୍ଡ ସହିତ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଥିଲା ଯାହା ଟ୍ରେସ୍‌ର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିଥିଲା । ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଥିବା ଅବନତି ଭୁଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ସହଜରେ ପ୍ରକଣ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, 3.36 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ ।

➤ ଏମ୍‌ଜିଏନଆରଇଡିଏସ୍ ଅଧିନରେ ଜରାଯାଇଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଷ୍ପଳ ଥିଲା ଏବଂ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରାଯାଇ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଏକ ବିଭାଜନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା କରିବାରେ ଡିଏଫ୍‌ଓ ଏବଂ ଡିଆରଡିଏ ସରକାର କୌଣସି ସମନ୍ୱୟ ନଥିଲା । ଏକ ବିଭାଜନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା କୁଶଳା ଶ୍ରମିକ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଡିଏଫ୍‌ଓ କିମ୍ବା ବିଭାଗ ସରକାର ନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଆରଡିଏ ନିକଟରୁ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା । ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବୃତ୍ତୀୟ ବର୍ଷ ଠାରୁ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହିସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏମ୍‌ଜିଏନଆରଇଡିଏସ୍ ଅଧିନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଫଳ ହେଲା ଏବଂ 13.17 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ ହେଲା ।

➤ ଏମ୍‌ଜିଏମ୍ ଅଧିନରେ ବାର୍ଦ୍ଧିଶ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁଳନାରେ ବିଭାଗ, ମାତ୍ର 51.74 ପ୍ରତିଶତ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା । ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଭୂମି ଚୟନ ଏବଂ ଖରାପ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ବାର୍ଦ୍ଧିଶ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ା ଖରାପ ଥିଲା । 40 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଜାମି ପନତା ଥିବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖରାପ ଆଲୋକ ଉପଲବ୍ଧତା ହେଲା ଏବଂ କୂଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବହୁତ କମ୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ।

ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରତିଶତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନକରି ବାର୍ଦ୍ଧିଶ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ 5.25 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଗୋଟିଏ ଜିଏସିରେ ଓଡିଡିଏ ଦ୍ୱାରା ଅନିୟମିତ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ପ୍ରକଳ୍ପ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଥିଲା ।

➤ ଯେହେତୁ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ୟାତ୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିନା ସହାୟକ ପ୍ରାକୃତିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନନ (ଏଏନଆର) ରେ କୌଣସି ଗଛ ପ୍ରକୃତରେ ଲଗା ନଯାଇ ଚାରି ବର୍ଷର ସମଗ୍ର ପୁନରୁତ୍ଥାନନ ଅବଧି ପାଇଁ ତଦାରଖ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟ ମାମାତର୍ଣ୍ଣରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବାରୁ 63.19 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ସହରାଞ୍ଚଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନକରି ମ୍ୟାନିଡେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ 39.80 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଚିରନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ, ମୂଲ୍ୟ ମାମାତର୍ଣ୍ଣକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିଯୁକ୍ତ କରିବାରେ ବିଭାଗ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଅଧିନରେ କିମ୍ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମାମାତର୍ଣ୍ଣରେ ଥିବା ନିୟମ ବାହରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା 99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ / ନିଷ୍ପଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ବାଡ଼ ଏବଂ ବୃତ୍ତୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 14.82 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସହରା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଧିନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ପ୍ରୟୁକ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ମାମାତର୍ଣ୍ଣରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଥିଲା । ସଡ଼କ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ହେତୁ ଆଭେନ୍ୟୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ଏବଂ ଅପ୍ରଭାବୀ ପର୍ଯ୍ୟଲୋଚନା ହେତୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ଏହିପରି କ୍ଷତି ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ତେଣୁ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ମାମାତର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

➤ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପରିକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ସରକାର ଅଧିକାରୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବରେ ରେଝ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୀକ୍ଷଣ/ ପର୍ଯ୍ୟଲୋଚନାର ଅଭାବ ଥିଲା । ବର୍ଷାଦ୍ୱାରା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଶତକଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ଯାହା ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ବିଭାଗର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ବିଫଳତା ସୃଷ୍ଟି କଲା ।

➤ ତେଣୁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅବକ୍ଷୟ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତ ଆଣିପାରି ନଥିଲା କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ବନୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରି ନଥିଲା ।

